

# 2023 年阜康市智慧校园二期建设项目

## 绩效评价报告



报告编号: XJPC 咨-2024-015-002

委托单位: 阜康市财政局

评价机构: 新疆谱诚项目管理咨询有限公司

报告时间: 2024 年 7 月 26 日



评价分值：91.34


评价等级：优



概要

评价机构全称（盖章）：新疆谱诚项目管理咨询有限公司单位：万元、类、个

项目名称	2023年阜康市智慧校园二期建设项目			评价年度	2023年
项目主管部门	阜康市教育局		联系人及联系方式		王玮琪 15199676878
自评方式	项目支出绩效自评表及自评报告	自评分值	100		自评等级 优
各级资金投入总数	2000	抽查资金总数	2000		资金抽查占比 100%
财政资金拨付数	2000	财政资金抽查数	2000		财政资金抽查占比 100%
项目类别	信息化建设类	抽查类别	信息化建设类		类别抽查占比 100%
项目数量	1	抽查项目数	1		项目抽查占比 100%
涉及市县数或项目点	1	抽查市县数或项目点	1	抽查区域	阜康市
发放调查问卷	300	有效调查问卷	82	满意度情况	教师满意度 90.38% 学生满意度 87.33%
绩效目标实现情况	截至2023年12月31日，（1）阜康市16所幼儿园、14所幼儿园分园（含分园和教学点）、阜康市职业中等专业学校共240间教室建设电子督学教室，部署电子督学前端设备。（2）在16所幼儿园、2所幼儿园分园、阜康市职业中等专业学校建立督学室，进行巡课督学。（3）阜康市15所幼儿园、14所幼儿园分园（含分园和教学点）、阜康市第二中学、阜康市九运街中小学、阜康市天龙小学、阜康市滋泥泉子镇中心小学和阜康市职业中等专业学校共349间教室建设智慧照明教室。（4）建设信息安全设备，满足督学平台信息安全等级保护二级要求。（5）租用阜康电信机房空间，原教育局服务器等设备搬迁至阜康电信机房，满足督学平台信息安全等级保护二级要求对机房环境的要求。（6）租用阜康电信机房空间至教育局机房光纤链路，满足原教育局机房内设备搬迁至阜康电信机房数据通信需求。（7）提供运营商OLT下沉至学校服务，共18套OLT下沉服务，覆盖阜康市中小学（8）测光验光设备18套，包括18套测光仪、18套验光设备及18套验光专用配套桌椅。（9）阜康市教育局建设标准化考场指挥中心、试卷库等。（10）阜康市第一中学建设标准化考场60间、一中分中心、考场大屏等。（11）阜康市第二中学建设标准化考场40间、二中分中心等。				
评价问题简要情况	（一）资金管理方面：项目预算编制不完整。（二）项目管理方面：1.制度健全性有待加强。2.项目资料归档及时性有待提高。3.资产管理规范性有待完善。4.项目未按计划时间竣工验收。5.项目产出情况未达预期。				
评价问题简要建议	（一）资金管理方面：提高预算编制精细度。（二）项目管理方面：1.加强制度建设。2.完善的归档制度，定期检查归档情况。3.制定资产计划，优化资产流程。4.提高沟通协调能力，加强项目风险管理。5.加强项目监控。				
评价结果应用建议	本项目绩效评价结果为“优”，从绩效管理方面来看，阜康市教育局绩效目标、绩效监控、绩效自评完成情况较好。因此，我司对本项目评价结果提出以下建议： （一）对评价中发现的问题进行整改 建议阜康市教育局对标对表、拉单列表，及时研究制定整改措施，确定整改期限，积极整改，加强制度建设，健全完善资金管理、项目管理和绩效管理等相关制度和办法，按期完成整改任务。 （二）下一年度预算安排 建议根据自治区及阜康市关于预算绩效管理相关政策要求，将本次重点项目绩效评价结果				

<p>作为阜康市教育局次年类似资金安排的参考依据，逐步健全绩效管理激励约束机制，促使部门履行好预算绩效管理的主体责任，促进阜康市教育局的预算编制更精准更科学更完整，绩效目标设置更明确更细化更全面，切实提高财政资源配置效率和使用效率。</p> <p><b>（三）评价结果公开</b></p> <p>建议按照政府信息公开等有关要求，遵循“谁组织实施、谁进行公开”的原则，根据上级统一部署，对绩效评价结果采取适度公开，不断提升绩效评价社会参与度。</p>			
评价时间	2024年6月28日-7月26日	评价机构报告编号	XJPC 咨-2024-015-002
项目主评人（签字） 及联系方式	胡月 18609907171	法定代表人（签字） 及联系方式	 18609907181

# 摘要

受阜康市财政局委托，新疆谱诚项目管理咨询有限公司于2024年6月28日至7月26日对阜康市教育局管理的2023年阜康市智慧校园二期建设项目资金开展了绩效评价，评价情况如下：

## 一、基本情况

### （一）项目实施主体

2023年阜康市智慧校园二期建设项目实施主体为阜康市教育局，其主要职能包括：

负责中小学思想政治教育和德育转普法宣传工作，负责州区德育乐范校和文明校园创建，组织、协调和指导校园文化建设各项工作。负责组织、管理、指导、协调、服务和安全工作；负责学校后勤服务、指导工作及学校资产、设施安全管理工作；负责指导、协调有关部门做好学校绿化、美化及创建工作。承担基础教育、学前教育课程教学研究指导工作；负责组织开展多种形式的研修活动，促进教师专业发展；负责基础教育和幼儿教育学科教学研究和指导、服务，参与全州各类教育教学质量评估、教学评价、监测工作；负责中小学信息化建设及远程教育工



作;统筹基础教育招生工作;承担普通高中、义务教育、学前教育和特殊教育的管理工作;负责成人职业技术教育和社会力量办学教育管理工作;负责国家通用语言文字的宣传规划、规范推广和普及应用等工作。负责全市高考、中考备考以及高中学业考试指导,组织普通、成人高等学校招生、成人高等教育自学考试,负责普通高中、初中学业水平测试。负责机关和所属事业单位机构编制、干部人事、教师继续教育及培训工作;负责小学、初中及幼儿教师资格认定工作;负责援疆教师和支教教师的协调管理工作。

## **(二) 项目主要内容**

### **1. 项目实施情况**

为加速“三通两平台”建设,“宽带网络校校通”实现提速增质,“优质资源班班通”和“网络学习空间人人通”实现提质增效,教育资源公共服务体系与教育管理公共服务体系有效融合,通过纵向构建区校一体化管理,横向打通教、学、考、评、管,帮助县(区)形成教育大数据,构建精准学习、精准管理、精准教学的智慧校园生态,2023年共完成:

(1) 阜康市 16 所幼儿园、14 所幼儿园分园(含分园和教学点)、阜康市职业中等专业学校共 240 间教室建设电子督学教室,部署电子督学前端设备。

(2) 在 16 所幼儿园、2 所幼儿园分园、阜康市职业中等专业学校建立督学室,进行巡课督学。

(3) 阜康市 15 所幼儿园、14 所幼儿园分园(含分园和教学点)、阜康市第二中学、阜康市九运街中小学、阜康市天龙小学、阜康市滋泥泉子镇中心小学和阜康市职业中等专业学校共 349 间教室建设智慧照明教室。

(4) 建设信息安全设备，满足督学平台信息安全等级保护二级要求。

(5) 租用阜康电信机房空间，原教育局服务器等设备搬迁至阜康电信机房，满足督学平台信息安全等级保护二级要求对机房环境的要求。

(6) 租用阜康电信机房空间至教育局机房光纤链路，满足原教育局机房内设备搬迁至阜康电信机房数据通信需求。

(7) 提供运营商 OLT 下沉至学校服务，共 18 套 OLT 下沉服务，覆盖阜康市中小学。

(8) 测光验光设备 18 套，包括 18 套测光仪、18 套验光设备及 18 套验光专用配套桌椅。

(9) 阜康市教育局建设标准化考场指挥中心、试卷库等。

(10) 阜康市第一中学建设标准化考场 60 间、一中分中心、考场大屏等。

(11) 阜康市第二中学建设标准化考场 40 间、二中分中心等。

## 2. 项目资金安排及使用情况

2023 年阜康市智慧校园二期建设项目全年预算总额 2000 万元，资金来源为一般政府债券资金，到位率为 100%。截至 2023

年 12 月 31 日，实际支出 2000 万元，执行率为 100%。主要用于支付智慧校园二期建设项目工程总承包合同款。

二、绩效评价综合情况及结论

项目绩效评价工作组通过研究、论证绩效评价指标体系及评分标准，采取数据采集、问卷调查和访谈的方式，对 2023 年阜康市智慧校园二期建设项目进行客观评价，该项目最终评价得分：91.34 分，评价等级：“优”。2023 年阜康市智慧校园二期建设项目绩效得分情况表见下表：

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重	10	25	35	30	100
分值	9.5	21.75	31.27	28.82	91.34
得分率	95%	87%	89.34%	96.07%	91.34%

三、主要经验及做法

为了确保项目的顺利进行，阜康市教育局制定了详细的项目计划，包括项目进度、人员分工、资源配置等。

在项目实施过程中，阜康市教育局加强了沟通协调，确保各部门和单位能够密切配合，共同推进项目。

为确保信息安全，阜康市教育局督促项目建设单位采取了严格的安全措施，包括数据加密、访问权限控制、安全审计等，确保信息的安全、可靠、可控。

四、存在问题

（一）资金管理方面

项目预算编制不完整。

项目预算编制依据项目立项批复、项目可行性研究报告以及《关于下达 2023 年自治区第一批地方政府债券转贷资金的通知》（昌州财预〔2023〕9 号），可行性研究报告中工程概算中的软、硬件购置费参考类似产品市场价格和厂商询价，但项目 2023 年预算总额为 2000 万元，而项目确定的总投资为 2600 万元，项目预算编制未含其配套资金，预算编制不够完整。

## **（二）项目管理方面**

### **1. 制度健全性有待加强。**

阜康市教育局未针对制定贴合阜康市智慧校园二期建设项目的实施制度和管理制度，制度健全性有待加强。

### **2. 项目资料归档及时性有待提高。**

通过核查项目资料，项目付款凭证、项目实施过程资料、招投标等资料保存完整健全，但发现项目资金到位文件《关于下达 2023 年自治区第一批地方政府债券转贷资金的通知》（昌州财预〔2023〕9 号）未及时归档。

### **3. 资产管理规范性有待完善。**

通过核查项目资料，项目于 2023 年 7 月 4 日正式完成验收，且于 2023 年 7 月 15 日完成竣工财务决算，项目已编制交付资产使用表，但截至评价节点，项目固定资产尚未录入系统。

### **4. 项目未按计划时间竣工验收。**

根据核查项目工程总承包合同，项目计划 2023 年 6 月 7 日竣工，但通过核查项目竣工验收报告，项目由于各个学校的验收点较为分散，最终于 2023 年 7 月 4 日竣工验收，共计推后 27 天。



## **5. 项目产出情况未达预期。**

通过核查项目竣工验收报告，项目于 2023 年 7 月 4 日正式完成验收，由于乡村幼儿园撤并的原因，共计完成 31 所教学点，未达批复建设规模及绩效目标表中数量指标“项目实施幼儿园、分园、教学点数，34 所”的预期值。

## **五、相关建议**

### **（一）资金管理方面**

#### **提高预算编制精细度。**

建议阜康市教育局一是在编制预算时，除了参考项目立项批复、项目可行性研究报告外，还应充分考虑其他相关文件和政策，确保预算编制的全面性和准确性；二是对预算编制中的各项费用进行详细分解，明确各项费用的具体用途和金额，避免出现预算遗漏或不明确的情况。

### **（二）项目管理方面**

#### **1. 加强制度建设。**

建议阜康市教育局，在以后开展类似项目时，制定针对性强的管理办法和制度。根据项目的预期开展的建设内容、实施情况，制定相关管理办法和制度，确保项目实施更具针对性和有效性。

#### **2. 完善的归档制度，定期检查归档情况。**

建议阜康市教育局一是明确项目资料归档的责任主体、归档范围、归档时间等要求，确保项目资料归档工作的规范进行；二是定期对项目资料归档情况进行检查，查漏补缺，发现问题及时整改，确保项目资料的完整归档。

### **3. 制定资产计划，优化资产流程。**

建议阜康市教育局一是明确资产管理责任主体、管理流程、资产登记和核算要求等，确保资产管理工作的规范进行；二是简化资产登记和核算流程，提高资产核算效率，确保项目资产在规定时间内完成登记和核算。

### **4. 提高沟通协调能力，加强项目风险管理。**

建议阜康市教育局，在以后开展类似项目时，一是项目各方要加强沟通协调，特别是对于验收环节，要提前与相关部门和单位进行沟通，确保验收工作的顺利进行；二是要加强项目风险管理，特别是对于可能影响项目进度的问题，要提前进行风险评估，并制定相应的应对策略。

### **5. 加强项目监控。**

加强对项目的监控，对于可能影响项目产出的因素，要及时进行预警，及时调整绩效目标，以防年底自评时产生偏差，并采取措施进行解决。

## **六、绩效评价结果应用建议**

本项目绩效评价结果为“优”，从绩效管理方面来看，阜康市教育局绩效目标、绩效监控、绩效自评完成情况较好。因此，我司对本项目评价结果提出以下建议：

### **（一）对评价中发现的问题进行整改**

建议阜康市教育局对标对表、拉单列表，及时研究制定整改措施，确定整改期限，积极整改，加强制度建设，健全完善资金管理、项目管理和绩效管理等相关制度和办法，按期完成整改

任务。

## **（二）下一年度预算安排**

建议根据自治区及阜康市关于预算绩效管理相关政策要求，将本次重点项目绩效评价结果作为阜康市教育局次年类似资金安排的参考依据，逐步健全绩效管理激励约束机制，促使部门履行好预算绩效管理的主体责任，促进阜康市教育局的预算编制更精准更科学更完整，绩效目标设置更明确更细化更全面，切实提高财政资源配置效率和使用效率。

## **（三）评价结果公开**

建议按照政府信息公开等有关要求，遵循“谁组织实施、谁进行公开”的原则，根据上级统一部署，对绩效评价结果采取适度公开，不断提升绩效评价社会参与度。

绩效评价工作组成员

序号	项目职务	姓名	执业（从业）资格	职称	备注
1	主评人、咨询部负责人	白国军	160148	注册风险管理师	
2	项目技术专家	孙健华	建[造]07650001491	高级工程师	
3	项目技术专家	谷雅敏	建[造]11016500004261	高级工程师	
4	项目财务专家	李传君	建[造]11026500004544	经济师	
5	项目负责人	樊欣悦	/	/	
6	项目组成员	赵艳红	/	/	
7	项目组成员	窦致良	/	/	
8	项目组成员	任俊英	/	/	



## 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目资金安排及使用情况 .....	6
(三) 项目组织情况及实施进展情况 .....	7
(四) 项目绩效目标情况 .....	9
(五) 绩效自评情况及结论 .....	11
二、绩效评价组织情况 .....	11
(一) 绩效评价目的 .....	11
(二) 绩效评价对象和范围 .....	12
(三) 绩效评价原则 .....	12
(四) 绩效评价依据 .....	13
(五) 绩效评价指标体系及标准 .....	13
(六) 绩效评价方法 .....	15
(七) 绩效评价抽样情况 .....	17
(八) 绩效评价工作过程 .....	17
三、绩效评价综合情况及结论 .....	19
(一) 绩效评价综合结论 .....	19
(二) 绩效目标实现情况 .....	20
四、绩效评价情况分析 .....	22
(一) 决策情况分析 .....	22
(二) 过程情况分析 .....	25
(三) 产出情况分析 .....	28
(四) 效益情况分析 .....	31

五、主要经验及做法 .....	33
六、存在问题及原因分析 .....	34
（一）资金管理方面 .....	34
（二）项目管理方面 .....	34
七、针对问题提出的建议 .....	35
（一）资金管理方面 .....	35
（二）项目管理方面 .....	36
八、绩效评价结果应用建议 .....	37
（一）对评价中发现的问题进行整改 .....	37
（二）下一年度预算安排 .....	37
（三）评价结果公开 .....	37
九、其他需说明的问题 .....	38
（一）关于评价责任的说明 .....	38
（二）本次绩效评价的局限性 .....	38
附件 1：综合评分表 .....	41
附件 2：基础数据表 .....	55
附件 3：访谈记录 .....	56
附件 4：满意度调查问卷结果分析报告以及调查问卷样表 .....	60
附件 5：项目调研照片 .....	71
附件 6：绩效评价报告征求部门意见反馈 .....	76
附件 7：项目单位报告及自评表 .....	77

# 阜康市财政局 2023 年阜康市智慧校园二期建设 项目资金绩效评价报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，强化预算单位预算绩效管理责任。阜康市财政局委托新疆谱诚项目管理咨询有限公司成立绩效评价工作组，于 2024 年 6 月 28 日至 7 月 26 日对阜康市教育局管理的 2023 年阜康市智慧校园二期建设项目资金开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目单位基本情况

2023 年阜康市智慧校园二期建设项目实施主体为阜康市教育局，其主要职能包括：

负责中小学思想政治教育和德育转普法宣传工作，负责区州德育乐范校和文明校园创建，组织、协调和指导校园文化建设各项工作。负责组织、管理、指导、协调、服务和安全工作；负责学校后勤服务、指导工作及学校资产、设施安全管理工作；负责指导、协调有关部门做好学校绿化、美化及创建工作。承担基础教育、学前教育课程教学研究指导工作；负责组织开展多种形式的研修活动，促进教师专业发展；负责基础教育和幼儿教育学科教学研究和指导、服务，参与全州各类教育教学质量评

估、教学评价、监测工作;负责中小学信息化建设及远程教育  
工作;负责统筹中小学实验教学和实验室规范化建设及信息化装  
备,指导中小学做好各类实验室、专用教室、教学仪器、电教  
器材、教学设备的管理和使用工作。综合管理全市基础教育工  
作;统筹基础教育招生工作;承担普通高中、义务教育、学前教  
育和特殊教育的管理工作;负责成人职业技术教育和社会力量  
办学教育管理工作;负责国家通用语言文字的宣传规划、规范推  
广和普及应用等工作。负责全市高考、中考备考以及高中学业  
考试指导,组织普通、成人高等学校招生、成人高等教育自学  
考试,负责普通高中、初中学业水平测试。负责机关和所属事  
业单位机构编制、干部人事、教师继续教育及培训工作;负责  
小学、初中及幼儿教师资格认定工作;负责援疆教师和支教教师  
的协调管理工作。

## **2. 项目设立背景及目的**

2018年4月13日教育部印发的《教育信息化2.0行动计划》中明确指出“以人工智能、大数据、物联网等新兴技术为基础,依托各类智能设备及网络,积极开展智慧教育创新研究和示范,推动新技术支持下教育的模式变革和生态重构;构建智慧学习支持环境。加强智慧学习的理论研究与顶层设计,推进技术开发与实践应用,提高人才培养质量。大力推进智能教育,开展以学习者为中心的智能化教学支持环境建设,推动人



工智能在教学、管理等方面的全流程应用，利用智能技术加快推动人才培养模式、教学方法改革，探索泛在、灵活、智能的教育教学新环境建设与应用模式。

“十四五”期间，教育信息化工作更要加贴近教育改革发展中的重大现实问题、融入教育发展的核心领域，为教育改革发展增添动力与手段。

通过深化信息技术与教育教学、教育管理的融合，强化教育信息化对教学改革，尤其是课程改革的服务与支撑，强化将教学改革，尤其是课程改革放在信息时代背景下来设计和推进。要聚焦教育改革发展过程中困扰教学、管理的核心问题和难点问题，将信息技术融入到教学和管理模式创新的过程中，以创新促发展，推动教育服务供给方式、教学和管理模式的变革，形成中国特色的教育信息化发展路径。

建成“人人皆学、处处能学、时时可学”、与国家教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系；基本实现教育信息化对学生全面发展的促进作用、对深化教育领域综合改革的支撑作用和对教育创新发展、均衡发展、优质发展的提升作用；基本形成具有国际先进水平、信息技术与教育融合创新发展的中国特色教育信息化发展路径。信息技术在教学、管理中为广大师生、管理者深度应用，信息技术与教育教学融合进一步深入，教师信息化教学能力、学生信息素养显著提升，形成一批有针

对性的信息化教学、管理创新模式。发展在线教育与远程教育，推动各类优质教育资源开放共享，向全社会提供服务。教育信息化对教育现代化的支撑作用充分彰显。要依托信息技术营造信息化教学环境，促进教学理念、教学模式和教学内容改革，推进信息技术在日常教学中的深入、广泛应用，适应信息时代对培养高素质人才的需求。

当前，云计算、大数据、物联网、移动计算等新技术逐步广泛应用，经济社会各行业信息化步伐不断加快，社会整体信息化程度不断加深，信息技术对教育的革命性影响日趋明显。

“十四五”期间，全面提升教育质量、在更高层次上促进教育公平、加快推进教育现代化进程等重要任务对教育信息化提出了更高要求，也为教育信息化提供了更为广阔的发展空间。

并且随着 AI 技术的成熟，安防系统已经实现系统从人眼感知到机器认知的跃升。目前学校各个业务场景智能设备开始引入，如何利用好这些 AI 设备和其产生的数据，提升教育系统的安全防范水平，发挥出数据的最大价值是“一中心两平台”迫切需要解决的问题。遵循智能前端感知、分级响应、数据汇聚、全网认知的理念，“一中心”将统领校园安防工作，统一建设标准，随时掌控校园师生动态数据，实现对层级以下单位的有效监控和适时调度管理。

因此智慧校园是教育信息化建设的必然阶段，2021 年，阜

康市教育局为全面实现教育信息化 2.0，开展了以三课课堂为中心，包含电子督学，德育班牌，互动录播

等子系统的阜康市教育综合云平台，该平台的建设，将阜康市下辖中小学及幼儿园进行了全面的信息化水平提升，为各校实现“三全两高一大”目标更近了一步。

为进一步建设智慧校园对于促进教师和学生尽快提高应用信息技术的水平,促进学校教学改革，推行素质教育，促进教学手段的现代化水平，全面提高幼儿园及学校现代化管理水平，加强学校与外界交流等方面都具有重要作用。阜康市在区、州党委、政府的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大和十九届一中、二中全会精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持把教育摆在优先发展的战略地位，高质量推进教育均衡发展，促进了全市教育质量的不断提升，为此启动“昌吉州阜康市智慧校园二期建设项目”。

### 3. 项目设立依据

（1）《教育部关于印发<教育信息化 2.0 行动计划>的通知》（教技〔2018〕6 号）；

（2）《教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》（教技〔2021〕6 号）；

（3）《教育部关于加强新时代教育管理信息化工作的通知》（教技〔2021〕13 号）；

(4) 《教育部办公厅关于印发《〈体育与健康〉教学改革指导纲要(试行)》的通知》(教体艺厅函〔2021〕28号);

(5)《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》(体发〔2020〕1号);

(6)《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》(教技〔2019〕16号);

(7)《网络学习空间建设与应用指南》(教技〔2018〕4号);

(8)《关于加强网络学习空间建设与应用的指导意见》(教技〔2018〕16号);

(9)《智慧校园总体框架》(GBT36342-2018);

(10)《中国教育现代化2035》;

(11)《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022年)》;

(12)《昌吉州阜康市智慧校园二期建设项目可行性研究报告》;

(13)《关于昌吉州阜康市智慧校园二期建设项目可行性研究报告的批复》(阜发改投资〔2021〕146号);

(14)《关于下达2023年自治区第一批地方政府债券转贷资金的通知》(昌州财预〔2023〕9号)。

## **(二) 项目资金安排及使用情况**

2023年阜康市智慧校园二期建设项目全年预算总额2000

万元，资金来源为阜康市财政拨款，资金到位率为 100%。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 2000 万元，预算执行率为 100%。主要用于对支付阜康市智慧校园二期建设项目工程总承包合同进度款。

### **（三）项目组织情况及实施进展情况**

#### **1. 项目组织情况**

为加快推进 2023 年阜康市智慧校园二期建设项目的组织实施，根据工作需要，为进一步明确工作职责，提高工作效能，确保各项工作高效有序运转。经局党组会议研究决定，该项目成立了项目领导小组：

组长:郑东育（教育局书记）

副组长：李伟（教育局局长）

项目负责人：刘军（教育局副局长）

组员：张鹏飞（项目装备办负责人）、白冰洋（项目装备办科员）、徐敏（计财科主任）

其中：李伟负责统筹工作，张鹏飞负责项目日常监管工作，白冰洋负责项目档案资料，徐敏负责资金拨付工作。

#### **2. 项目实施进展情况**

为加速“三通两平台”建设，“宽带网络校校通”实现提速增质，“优质资源班班通”和“网络学习空间人人通”实现提质增效，教育资源公共服务体系与教育管理公共服务体系有

效融合，通过纵向构建区校一体化管理，横向打通教、学、考、评、管，帮助县（区）形成教育大数据，构建精准学习、精准管理、精准教学的智慧校园生态，2023 年共完成：

（1）阜康市 16 所幼儿园、14 所幼儿园分园（含分园和教学点）、阜康市职业中等专业学校共 240 间教室建设电子督学教室，部署电子督学前端设备。

（2）在 16 所幼儿园、2 所幼儿园分园、阜康市职业中等专业学校建立督学室，进行巡课督学。

（3）阜康市 15 所幼儿园、14 所幼儿园分园（含分园和教学点）、阜康市第二中学、阜康市九运街中小学、阜康市天龙小学、阜康市滋泥泉子镇中心小学和阜康市职业中等专业学校共 349 间教室建设智慧照明教室。

（4）建设信息安全设备，满足督学平台信息安全等级保护二级要求。

（5）租用阜康电信机房空间，原教育局服务器等设备搬迁至阜康电信机房，满足督学平台信息安全等级保护二级要求对机房环境的要求。

（6）租用阜康电信机房空间至教育局机房光纤链路，满足原教育局机房内设备搬迁至阜康电信机房数据通信需求。

（7）提供运营商 OLT 下沉至学校服务，共 18 套 OLT 下沉服务，覆盖阜康市中小学。

（8）测光验光设备 18 套，包括 18 套测光仪、18 套验光设

备及 18 套验光专用配套桌椅。

(9) 阜康市教育局建设标准化考场指挥中心、试卷库等。

(10) 阜康市第一中学建设标准化考场 60 间、一中分中心、考场大屏等。

(11) 阜康市第二中学建设标准化考场 40 间、二中分中心等。

### **3. 制度建设情况**

阜康市教育局遵照《中华人民共和国预算法》《内控管理制度》等文件的要求，制定了相应的固定资产管理制度、合同管理内部控制制度、货币资金管理制度、建设项目管理制度、收支管理内部控制制度、无形资产管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度。财务和业务管理制度合法、合规。

#### **(四) 项目绩效目标情况**

**总目标：**教育局负责全市各级各类教育的统筹规划和综合协调，负责市各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设。为进一步建设智慧校园对于促进教师和学生尽快提高应用信息技术水平，阜康市启动“阜康市智慧校园二期建设项目”，教育局 2023 年计划实施该项目。

**主要内容：**对阜康市 34 所幼儿园、分园、教学点进行智慧校园信息化建设；建设智慧幼儿园(包括电子督学设备、智慧照明系统)；建设智慧校园数据中心等 7 个建设项目，工

工程项目验收合格率预计达到 100%，设施设备采购质量合格率预计达到 100%，财政投入 2000 万元(其中：工程 30%预付款 647.94 万元、80%进度款 1079.9 万元、97%进度款 272.16 万元)用于该项目，资金预计于 2023 年 7 月底前 100%及时支付完毕。项目的实施预计达到促进教育信息资源合理有效配置，加强教育信息化师资队伍建设的效果。

**阶段性目标：**阜康市教育局根据预算绩效管理要求编制了项目绩效目标，所设定的绩效指标与实际工作内容具有相关性，绩效指标设置量化率达到 81.82%，满足了量化指标需占指标总数 70%及以上的规范要求，能够完整反映项目产出和效果实现情况。

绩效目标及指标如下：

<b>总体目标</b>	教育局负责全市各级各类教育的统筹规划和综合协调，负责市各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设。为进一步建设智慧校园对于促进教师和学生尽快提高应用信息技术水平，我市启动“阜康市智慧校园二期建设项目”，教育局 2023 年计划实施该项目。主要建设内容：对阜康市 34 所幼儿园、分园、教学点进行智慧校园信息化建设；建设智慧幼儿园(包括电子督学设备、智慧照明系统)；建设智慧校园数据中心等 7 个建设项目，工程项目验收合格率预计达到 100%，设施设备采购质量合格率预计达到 100%，财政投入 2000 万元（其中：工程 30%预付款 647.94 万元、80%进度款 1079.9 万元、97%进度款 272.16 万元）用于该项目，资金预计于 2023 年 7 月底前 100%及时支付完毕。项目的实施预计达到促进教育信息资源合理有效配置，加强教育信息化师资队伍建设的效果。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>说明</b>
产出	数量指标	项目实施幼儿园、分园、教学点数	$\geq 34$ 所	建议保持不变。
		阜康市智慧校园二期建设项目建设内容数	$\geq 7$ 个	建议根据建设内容再细化。
	质量指	工程项目验收合格率	$=100\%$	建议保持不变。



	标	设施设备采购质量合格率	=100%	建议保持不变。
	时效指标	资金支付及时率	=100%	建议保持不变。
		资金支付工作完成时限	2023 年 7 月底前	建议保持不变。
	成本指标	阜康市智慧校园二期建设项目工程建设 30%预付款	≤647.94 万元	建议保持不变。
		阜康市智慧校园二期建设项目工程建设 80%进度款	≤1079.9 万元	建议保持不变。
		阜康市智慧校园二期建设项目工程建设 97%进度款	≤272.16 万元	建议保持不变。
效益	社会效益指标	教育信息资源合理有效配置	促进	建议保持不变。
		教育信息化师资队伍建设	加强	建议保持不变。

## （五）绩效自评情况及结论

阜康市教育局在正式接到阜康市财政局下发的绩效自评任务后，根据项目实施情况，对 2023 年阜康市智慧校园二期建设项目开展绩效自评，项目单位自评表及自评报告得分均为 100 分，评价等级为“优”。

## 二、绩效评价组织情况

### （一）绩效评价目的

一是掌握项目实施整体情况。根据设定的绩效目标，实地考察项目实施情况，并进行全面、客观、科学、公正地评价，为进一步做好自治区本级类似项目提供参考依据。二是推动 2023 年阜康市智慧校园二期建设项目取得实效，确保项目单位能够科学、

规范地高质量完成目标任务。三是提高资金利用率，充分发挥财政资金使用效益。

## **（二）绩效评价对象和范围**

### **1. 绩效评价对象**

绩效评价对象为阜康市教育局实施的 2023 年阜康市智慧校园二期建设项目,该项目资金总金额 2000 万元,评价金额 2000 万元。

### **2. 绩效评价范围**

绩效评价的范围：2023 年阜康市智慧校园二期建设项目的项目决策、项目的产出、完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况、绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

## **（三）绩效评价原则**

1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

#### **（四）绩效评价依据**

1. 《中华人民共和国预算法》；

2. 财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预〔2011〕285号）；

3. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

4. 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）；

5. 《关于印发〈第三方机构绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）；

6. 自治区财政厅《关于印发〈自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕148号）；

7. 《关于印发自治区项目支出绩效目标设置指引的通知》（新财预〔2022〕42号）。

#### **（五）绩效评价指标体系及标准**

##### **1. 绩效评价指标体系**

绩效评价指标体系是开展绩效评价的核心。绩效评价指标体系包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

### （1）确定绩效评价指标

第一步，采用层次分析法，建立绩效评价指标体系。绩效评价指标体系分为项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

第二步，采用专家调查法，确定绩效评价指标。评价指标体系建立后，邀请专家对指标体系中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。

### （2）确定权重

采用专家调查法，确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。因此项目决策权重为 10%，项目管理权重占 25%，项目产出权重占 35%，项目效益权重占 30%。

### （3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。本次绩效评价采用计划标准、通用标准、历史标准等确定此次绩效评价指标标准值。

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）第十八条：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设

定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

评价计分结果	评价结果级别
90 分（含）~100 分	优
80 分（含）~90 分	良
60 分（含）~80 分	中
60 分以下	差

## 2. 绩效评价标准

通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

## （六）绩效评价方法

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此计算具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

### **1. 成本效益分析法**

成本效益分析法是指将一定时期内总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。2023 年阜康市智慧校园二期建设项目结合预算支出确定的目标，比较支出所产生的效益及所付出的成本。分析总成本与所取得的效益是否匹配，项目支出是否符合资金管理文件，以及该项目产出效益是否明显等。

### **2. 因素分析法**

我们通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对 2023 年阜康市智慧校园二期建设项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

### **3. 公众评判法：**

公众评判法是指通过专家评审、公众问卷及抽样调查等形式对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（1）专家评审：本次绩效评价工作将采用全程专家（主评人）评价方式，主评人参与项目评价，提出项目决策、管理以及绩效方面的问题，并给出相应意见，提升本次绩效评价的深度。

(2) 公众问卷法：评价工作组将针对项目进行调研，主要调研项目实施的必要性、产生的效益以及受益群众满意度等问题。

对项目实际使用人员的调查问卷，主要从项目实际实施的角度了解项目实施情况。由于本项目受益群体分别为阜康市教师及学生，所以本次问卷调查分别设置问卷调查的对象，计划发放并回收有效问卷 300 份。

### (七) 绩效评价抽样情况

2023 年阜康市智慧校园二期建设项目属于信息化建设类项目，该项目 2023 年度下达资金 2000 万元，均为一般债券资金，本次针对 2023 年度项目资金开展绩效评价工作，抽样占比为 100%

### (八) 绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备

本次评价，委托方为阜康市财政局，受托方为新疆谱诚项目管理咨询有限公司。新疆谱诚项目管理咨询有限公司按照委托方对该项目评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案，具体人员名单如下：

#### 绩效评价小组人员安排

序号	姓名	项目中的定位	主要执业资格和职称	具体分工
1	白国军	技术负责人、主评人	注册风险管理师	参与绩效评价指标设计，负责绩效评价项目的总体质量把控；负责工作方案和绩效评价报告的终审。
2	孙健华	项目技术专家	高级工程师	参与绩效评价指标设计，项目报告的核查检验工作。

序号	姓名	项目中的定位	主要执业资格和职称	具体分工
3	谷雅敏	项目技术专家	高级工程师	参与绩效评价指标设计，项目报告的核查检验工作。
4	李传君	项目财务专家	经济师	参与绩效评价指标设计，项目报告的核查检验工作。
5	樊欣悦	项目负责人	/	起草项目工作方案；参与具体项目绩效评价指标体系的设计；参与项目实施单位的沟通，包括方案和报告初稿意见征求；参与具体项目的其他实施工作。
6	赵艳红	项目组成员	/	参与具体项目的实施工作，包括社会调查、数据收集、整理、计算、核对、分析工作、校对文档等工作
7	窦致良	项目组成员	/	参与具体项目的实施工作，包括社会调查、数据收集、整理、计算、核对、分析工作、校对文档等工作。
10	任俊英	项目组成员	/	参与具体项目的实施工作，包括社会调查、数据收集、整理、计算、核对、分析工作、校对文档等工作。

## 2. 组织实施

本次项目的评价期间为 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 26 日，具体安排如下：

### （1）方案制定（2024 年 6 月 30 日前）

受阜康市财政局委托后，对项目资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解项目资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

### （2）评价实施阶段（2024 年 7 月 15 日前）

资料收集（2024 年 7 月 4 日前）。将资料清单发送至部门单位，预算主管部门、相关部门及科室按照预算绩效管理要求提供



项目立项、申报、管理、资金使用、项目实施、过程管理、完成情况等相关信息和资料。

社会调查及资料整理（2024年7月15日前）。根据社会调查方案，对预算主管部门、相关负责人进行访谈，并对相关数据信息进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。社会调查结束后，对相关材料及数据进行分析整理，并撰写形成问卷调查报告和访谈报告。

#### （3）报告撰写阶段（2024年7月22日前）

综合分析及撰写评价报告。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行综合分析，并形成评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

#### （4）单位征求意见（2024年7月25日前）

7月24我单位将绩效评价报告和征求意见函提交项目单位征求意见，时限为一个工作日，截至7月25日项目单位未对报告反馈意见，视为无意见。

#### （5）报告提交（2024年7月26日前）

撰写完成的绩效评价报告提交阜康市财政局，并根据阜康市财政局的安排与预算单位沟通确认。

### 三、绩效评价综合情况及结论

#### （一）绩效评价综合结论

项目绩效评价工作组通过研究、论证绩效评价指标体系及评分标准，采取数据采集、问卷调查和访谈的方式，对2023年阜

康市智慧校园二期建设项目进行客观评价，项目最终评价得分：91.34 分，评价等级：“优”。

项目决策类指标权重为 10 分，得分为 9.5 分，得分率为 95%，主要原因为预算编制不够完整。

项目过程类指标权重为 25 分，得分为 21.75 分，得分率为 87%，主要原因为项目管理制度不够健全，制度执行的有效性有待加强，资产管理规范性有待加强。

项目产出类指标权重为 35 分，得分为 31.27 分，得分率为 89.34%。主要原因为由于乡村幼儿园撤并的原因，完成信息化教学点未达预期；项目未按计划时间竣工验收。

项目效益类指标权重为 30 分，得分为 28.82 分，得分率为 96.07%。

项目具体打分情况见附件 1 综合评分表。

表 3-12023 年阜康市智慧校园二期建设项目绩效得分情况表

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重	10	25	35	30	100
分值	9.5	21.75	31.27	28.82	91.34
得分率	95%	87%	89.34%	96.07%	91.34%

（二）绩效目标实现情况

根据梳理后设置的绩效目标及指标，依据现场调研及访谈重新填报绩效目标及指标完成情况。具体情况见下表 3-2：

表 3-2 绩效目标及指标完成情况表

2023 总体目标	2023 总体目标完成情况
-----------	---------------

<p>教育局负责全市各级各类教育的统筹规划和综合协调，负责市各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设。为进一步建设智慧校园对于促进教师和学生尽快提高应用信息技术的水平，我市启动“阜康市智慧校园二期建设项目”，教育局2023年计划实施该项目。主要建设内容:对阜康市34所幼儿园、分园、教学点进行智慧校园信息化建设；建设智慧幼儿园(包括电子督学设备、智慧照明系统)；建设智慧校园数据中心等7个建设项目，工程项目验收合格率预计达到100%，设施设备采购质量合格率预计达到100%，财政投入2000万元（其中：工程30%预付款647.94万元、80%进度款1079.9万元、97%进度款272.16万元）用于该项目，资金预计于2023年7月底前100%及时支付完毕。项目的实施预计达到促进教育信息资源合理有效配置，加强教育信息化师资队伍建设的效果。</p>		<p>截至2023年12月31日，本项目完成对阜康市34所幼儿园、分园、教学点进行智慧校园信息化建设；建设智慧幼儿园(包括电子督学设备、智慧照明系统)；建设智慧校园数据中心等7个建设项目，工程项目验收100%合格，设施设备采购质量100%合格，工程30%预付款647.94万元、80%进度款1079.9万元及97%进度款272.16万元已全部及时支付完毕，达到促进教育信息资源合理有效配置，加强教育信息化师资队伍建设的效益。</p>	
三级指标	指标值	指标完成情况	完成情况说明
项目实施幼儿园、分园、教学点数	≥34所	31所	由于乡村幼儿园撤并的原因，共计完成31所教学点。
阜康市智慧校园二期建设项目建设内容数	≥7个	7个	已完成
工程项目验收合格率	=100%	100%	已完成
设施设备采购质量合格率	=100%	100%	已完成
资金支付及时率	=100%	100%	已完成
资金支付工作完成时限	2023年7月底前	2023年7月27日	已完成
阜康市智慧校园二期建设项目工程建设30%预付款	≤647.94万元	647.94万元	已完成
阜康市智慧校园二期建设项目工程建设80%进度款	≤1079.9万元	1079.9万元	已完成
阜康市智慧校园二期建设项目工程建设97%进度款	≤272.16万元	272.16万元	已完成
教育信息资源合理有效配置	促进	100%	97.56%

教育信息化师资队伍建设的	加强	100%	97.56
--------------	----	------	-------

## 四、绩效评价情况分析

### （一）决策情况分析

项目决策类指标是从项目立项、绩效目标与资金投入三个方面来对项目进行考察，对立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、及资金分配合理性进行分析。项目决策类指标分值 10 分，实际得分 9.5 分。各指标详细得分情况如下表 4-1 所示：

表 4-1 项目决策指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	10	项目立项	3	立项依据充分性	1.5	1.5
				立项程序规范性	1.5	1.5
		绩效目标	3	绩效目标合理性	1.5	1.5
				绩效指标明确性	1.5	1.5
		资金投入	4	预算编制科学性	2	1.5
				资金分配合理性	2	2
合计			10		10	9.5

对于“立项依据充分性”：①项目立项依据根据《教育部关于印发<教育信息化 2.0 行动计划>的通知》（教技〔2018〕6 号）、《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022 年）》《关于昌吉州阜康市智慧校园二期建设项目可行性研究报告的批复》（阜发改投资〔2021〕146 号）、《关于下达 2023 年自治区第一批地方政府债券转贷资金的通知》（昌州财预

〔2023〕9号），符合国相关政策及发展规划；②与阜康市教育局“负责全市各级各类教育的统筹规划和综合协调，负责市各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；负责中小学信息化建设及远程教育；负责统筹中小学实验教学和实验室规范化建设及信息化装备，指导中小学做好各类实验室、专用教室、教学仪器、电教器材、教学设备的管理和使用工作。综合管理全市基础教育；”的部门职责范围相符，属于部门履职所需。③项目符合公共财政支持范围。④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

综上所述，该指标满分 1.5 分，得分 1.5 分。

对于“立项程序规范性”：项目属于信息化建设类项目，属于财政支持范围。评价小组通过核查《关于申请昌吉州阜康市智慧校园建设项目二期可研批复的函》《关于昌吉州阜康市智慧校园二期建设项目可行性研究报告的批复》（阜发改投资〔2021〕146号）《关于下达 2023 年自治区第一批地方政府债券转贷资金的通知》（昌州财预〔2023〕9号），认为项目符合立项程序，项目申请及审批文件，提交的文件、资料均符合相关要求，提交的材料充分，同时也具有较高的真实性，项目审批文件材料符合相关要求。项目通过《阜康市项目工作领导小组会议纪要》（阜项目领导小组〔2022〕1号），项目经过必要的集体决策。

综上所述，该指标满分 1.5 分，得分 1.5 分。

对于“绩效目标合理性”：阜康市教育局按照预算绩效管理要求编制了《项目支出绩效目标表》，根据设定的绩效目标表，项目绩效目标符合相关法律法规、行业中长期规划，与实际工作内容具有相关性，与项目预算资金量相匹配。

综上所述，该指标满分 1.5 分，得分 1.5 分。

对于“绩效指标明确性”：根据项目《项目支出绩效目标表》可知，阜康市教育局将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，该项目共设置 11 条绩效指标，其中有 9 条绩效指标已量化，指标量化率达到 81.82%，满足了量化指标需占指标总数 70%及以上的规范要求，并满足三级指标 $\geq 7$ 条的基本要求，指标值设立依据、分值权重、赋分规则及佐证资料等的填报符合《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101 号）及《关于印发自治区项目支出绩效目标设置指引的通知》（新财预〔2022〕42 号）文件的要求。

综上所述，该指标满分 1.5 分，得分 1.5 分。

对于“预算编制科学性”：项目预算编制依据项目立项批复、项目可行性研究报告以及《关于下达 2023 年自治区第一批地方政府债券转贷资金的通知》（昌州财预〔2023〕9 号），可行性研究报告中工程概算中的软、硬件购置费参考类似产品

市场价格和厂商询价，但项目 2023 年预算总额为 2000 万元，而项目确定的总投资为 2600 万元，项目预算编制未含其配套资金，预算编制不够完整，扣除 0.5 分。

综上所述，该指标满分 2 分，扣 0.5 分，得分 1.5 分。

对于“资金分配合理性”：项目预算资金的分配是依据《关于下达 2023 年自治区第一批地方政府债券转贷资金的通知》（昌州财预〔2023〕9 号）等文件，资金支付按照项目工程总承包合同中施工进度付款，资金分配数额按项目预算数额分配，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。

**（二）过程情况分析**

项目过程类指标是从项目的资金管理和组织实施两个方面来对项目实施进行考察，主要从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、工程变更规范性、项目资产管理规范性、债务信息公开完备性、债务偿还率进行分析。项目过程类指标分值 25 分，实际得分 21.75 分。各指标详细得分情况如下表 4-2 所示：

表 4-2 项目过程指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目过程	25	资金管理	10	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
				资金使用合规性	4	4

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
		组织实施	15	管理制度健全性	3	2
				制度执行有效性	3	2.25
				工程变更规范性	3	3
				项目资产管理规范性	3	1.5
				债务信息公开完备性	2	2
				债务偿还率	1	1
合计			25		25	21.75

对于“资金到位率”：根据核查《关于下达 2023 年自治区第一批地方政府债券转贷资金的通知》（昌州财预〔2023〕9 号），2023 年 2 月 13 日到位一般债券资金 2000 万元，故资金到位率=（2000/2000）×100%=100%。

综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。

对于“预算执行率”：根据阜康市教育局提供的支付凭证，截止至 2023 年 12 月 31 日，共计支出 2000 万元。（2000/2000）×100%=100%。

综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。

对于“资金使用合规性”：经查核查相关资金支付凭证，该项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，该指标满分 4 分，得分 4 分。



**对于“管理制度健全性”：**阜康市教育局遵照《中华人民共和国预算法》《内控管理制度》等文件的要求，制定了相应的固定资产管理制度、合同管理内部控制制度、货币资金管理制度、建设项目管理制度、收支管理内部控制制度、无形资产管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度。财务和业务管理制度合法、合规。但未针对制定贴合阜康市教育局 2023 年阜康市智慧校园二期建设项目的实施制度和管理制度，故扣 1 分。

**综上所述，该指标满分 3 分，扣 1 分，得分 2 分。**

**对于“制度执行有效性”：**通过核查项目资料，项目付款凭证、项目实施过程资料、招投标等资料保存完整健全，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。但发现项目资金到位文件《关于下达 2023 年自治区第一批地方政府债券转贷资金的通知》（昌州财预〔2023〕9 号）未及时归档，故扣除 0.75 分。

**综上所述，该指标满分 3 分，扣 0.75 分，得分 2.25 分。**

**对于“工程变更规范性”：**通过核查资料及访谈，项目不存在重大变更。

**综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。**

**对于“项目资产管理规范性”：**通过核查项目资料，项目于 2023 年 7 月 4 日正式完成验收，且于 2023 年 7 月 15 日完

成竣工财务决算，项目已编制交付资产使用表，但截至评价节点，项目固定资产尚未录入系统，较为缓慢，扣除 1.5 分。

综上所述，该指标满分 3 分，扣 1.5 分，分 1.5 分。

对于“债务信息公开完备性”：根据核查债务公开信息，阜康市财政局按照《自治区地方政府债务信息公开办法》中”第十条【一般债券存续期公开】地县财政部门应当组织开展本地区对级一般债券存续期信息公开工作，督促和指导使用一般债券资金的门不迟于每年 5 月底前公开”对项目的债务信息公开。

综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。

对于“债务偿还率”：通过核查项目资金到位文件及现场访谈，项目资金来源主要为一般债券资金，其还款来源为阜康市财政还款，故债务偿还率为 100%。

综上所述，该指标满分 2.5 分，得分 2.5 分。

（三）产出情况分析

项目产出类指标是从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面来对项目产出方面进行考察。项目产出指标分值 35 分，实际得分 31.27 分。各指标详细得分情况如下表 4-3 所示：

表 4-3 项目产出指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
------	----	------	----	------	----	----

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
产出	35	产出数量	15	智慧校园信息化建设教学点数	6	3.35
				建设智慧幼儿园完成率	5	5
				新建智慧校园数据中台完成率	4	4
		产出质量	8	项目竣工验收合格率	3	3
				设施设备采购质量合格率	2	2
				建设信息设备安全等级	3	3
		产出时效	6	项目资金支付及时率	2	2
				项目按计划完工率	4	2.92
		产出成本	6	项目成本控制率	6	6
合计			35		35	31.27

对于“智慧校园信息化建设教学点数”：通过核查项目竣工验收报告，项目于2023年7月4日正式完成验收，其中验收内容“阜康市职业中等专业学校共240间教室建设电子督学教室，部署电子督学前端设备。”，由于乡村幼儿园撤并的原因，共计完成31所教学点。完成率=  $(31/34) \times 100\% = 91.18\%$ ，扣除2.65分。

综上所述，该指标满分6分，扣除2.65分，得分3.35分。

对于“建设智慧幼儿园完成率”：通过核查项目竣工验收报告，项目于2023年7月4日正式完成验收，建设智慧幼儿园完成率达到100%。

综上所述，该指标满分5分，得分5分。

对于“新建智慧校园数据中台完成率”：通过核查项目竣

工验收报告，项目于 2023 年 7 月 4 日正式完成验收，新建智慧校园数据中台完成率达到 100%。

综上所述，该指标满分 4 分，得分 4 分。

对于“项目竣工验收合格率”：通过核查项目竣工验收报告，项目于 2023 年 7 月 4 日正式完成验收，项目整体验收结论为合格。

综上所述，该指标满分 4 分，得分 4 分。

对于“设施设备采购质量合格率”：通过核查项目竣工验收报告，项目于 2023 年 7 月 4 日正式完成验收，其中完成电子督学前端设备、智慧照明护眼灯、机房设备、测光验光设备、网络下沉 OLT 等设备验收，验收结论为合格。

综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。

对于“建设信息设备安全等级”：通过核查项目竣工验收报告，项目于 2023 年 7 月 4 日正式完成验收，其中验收内容中“4、建设信息安全设备，满足督学平台信息安全等级保护二级要求”，验收结论为合格。

综上所述，该指标满分 4 分，得分 4 分。

对于“项目资金支付及时率”：根据核查项目支付凭证，资金支付按照项目工程总承包合同中施工进度付款，资金支付及时。

综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。

对于“项目按计划完工率”：根据核查项目工程总承包合同，项目计划 2023 年 6 月 7 日竣工，但通过核查项目竣工验收报告，项目由于各个学校的验收点较为分散，最终于 2023 年 7 月 4 日竣工验收，共计推后 27 天，故扣除 1.08 分。

综上所述，该指标满分 6 分，扣 1.08 分，得分 2.92 分。

对于“项目成本控制率”：根据核查项目工程总承包合同，合同价为 2159.8 万元，通过核查《昌吉州阜康市智慧校园二期建设项目竣工财务决算审核报告》中工程造价审定金额为 2159.79 万元，故项目最终审定价未超出合同价，且未超出项目总投资 2600 万元。

综上所述，该指标满分 6 分，得分 6 分。

**（四）效益情况分析**

项目效益类指标是从社会效益、受益群众满意度两个方面来对项目效益方面进行考察。项目绩效指标分值 30 分，实际得分 28.82 分。各指标详细得分情况如下表 4-4 所示：

表 4-4 项目效益指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
效益	30	社会效益指标	20	提升学生学习和教学质量	6	5.81
				长期构建精准学习、精准管理、精准教学的智慧校园生态	4	3.93
				教育信息资源合理有效配置	6	5.85
				教育信息化师资队伍建设	4	3.9

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
		满意度指标	10	教师满意度	5	5
				学生满意度	5	4.33
合计			30		30	28.82

对于“提升学生学习和教学质量”：根据项目满意度问卷调查，回收有效问卷共 82 份，对于问题“第 6 题：您认为电子督学是否能提升学生学习和教学质量？”认为“能” 69 人，“不确定” 13 人，故该项完成率为 96.83%，扣除 0.19 分。

综上所述，该指标满分 6 分，扣 0.19 分，得分 5.81 分。

对于“长期构建精准学习、精准管理、精准教学的智慧校园生态”：根据项目满意度问卷调查，回收有效问卷共 82 份，对于问题“第 12 题：您认为项目的建设能否长期构建精准学习、精准管理、精准教学的智慧校园生态？”认为“能” 75 人，“不确定” 7 人，故该项完成率为 98.29%，扣除 0.07 分。

综上所述，该指标满分 4 分，扣 0.07 分，得分 3.93 分。

对于“教育信息资源合理有效配置”：根据项目满意度问卷调查，回收有效问卷共 82 份，对于问题“第 9 题：您认为项目的实施是否能使阜康市教育信息资源得到合理的有效配置？”认为“能” 72 人，“不确定” 10 人，故该项完成率为 97.56%，扣除 0.15 分。

综上所述，该指标满分 6 分，扣 0.15 分，得分 5.85 分。

对于“教育信息化师资队伍建设”：根据项目满意度问卷

调查，回收有效问卷共 82 份，对于问题“第 10 题：您认为项目的实施是否能加强教育信息化的师资队伍建设？”认为“能” 72 人，“不确定” 10 人，故该项完成率为 97.56%，扣除 0.1 分。

综上所述，该指标满分 6 分，扣 0.1 分，得分 3.9 分。

对于“教师满意度”：根据项目满意度问卷调查，回收教师满意度有效问卷共 52 份，对于问题“第 15 题：您对智慧校园二期建设项目的整体规划是否满意？”其中选择非常满意 35 人，比较满意 15 人，故教师满意度为 90.38%。

综上所述，该指标满分 5 分，得分 5 分。

对于“学生满意度”：根据项目满意度问卷调查，回收学生满意度有效问卷共 30 份，对于问题“第 14 题：您对教室中的护眼灯的使用效果是否满意？是否能起到护眼效果？”其中选择非常满意 19 人，比较满意 9 人，故学生满意度为 87.33%，扣除 0.67 分。

综上所述，该指标满分 5 分，扣 0.67 分，得分 4.33 分。

## 五、主要经验及做法

为了确保项目的顺利进行，阜康市教育局制定了详细的项目计划，包括项目进度、人员分工、资源配置等。

在项目实施过程中，阜康市教育局加强了沟通协调，确保各部门和单位能够密切配合，共同推进项目。

为确保信息安全，阜康市教育局督促项目建设单位采取了严格的安全措施，包括数据加密、访问权限控制、安全审计等，确保信息的安全、可靠、可控。

## **六、存在问题及原因分析**

### **（一）资金管理方面**

#### **项目预算编制不完整。**

项目预算编制依据项目立项批复、项目可行性研究报告以及《关于下达 2023 年自治区第一批地方政府债券转贷资金的通知》（昌州财预〔2023〕9 号），可行性研究报告中工程概算中的软、硬件购置费参考类似产品市场价格和厂商询价，但项目 2023 年预算总额为 2000 万元，而项目确定的总投资为 2600 万元，项目预算编制未含其配套资金，预算编制不够完整。

### **（二）项目管理方面**

#### **1. 制度健全性有待加强。**

阜康市教育局未针对制定贴合阜康市智慧校园二期建设项目的实施制度和管理制度，制度健全性有待加强。

#### **2. 项目资料归档及时性有待提高。**

通过核查项目资料，项目付款凭证、项目实施过程资料、招投标等资料保存完整健全，但发现项目资金到位文件《关于下达 2023 年自治区第一批地方政府债券转贷资金的通知》（昌州财预〔2023〕9 号）未及时归档。



### **3. 资产管理规范性有待完善。**

通过核查项目资料，项目于 2023 年 7 月 4 日正式完成验收，且于 2023 年 7 月 15 日完成竣工财务决算，项目已编制交付资产使用表，但截至评价节点，项目固定资产尚未录入系统。

### **4. 项目未按计划时间竣工验收。**

根据核查项目工程总承包合同，项目计划 2023 年 6 月 7 日竣工，但通过核查项目竣工验收报告，项目由于各个学校的验收点较为分散，最终于 2023 年 7 月 4 日竣工验收，共计推后 27 天。

### **5. 项目产出情况未达预期。**

通过核查项目竣工验收报告，项目于 2023 年 7 月 4 日正式完成验收，由于乡村幼儿园撤并的原因，共计完成 31 所教学点，未达批复建设规模及绩效目标表中数量指标“项目实施幼儿园、分园、教学点数，34 所”的预期值。

## **七、针对问题提出的建议**

### **（一）资金管理方面**

#### **提高预算编制精细度。**

建议阜康市教育局一是在编制预算时，除了参考项目立项批复、项目可行性研究报告外，还应充分考虑其他相关文件和政策，确保预算编制的全面性和准确性；二是对预算编制中的各项费用进行详细分解，明确各项费用的具体用途和金额，避免出现预算遗漏或不明确的情况。

## **（二）项目管理方面**

### **1. 加强制度建设。**

建议阜康市教育局，在以后开展类似项目时，制定针对性强的管理办法和制度。根据项目的预期开展的建设内容、实施情况，制定相关管理办法和制度，确保项目实施更具针对性和有效性。

### **2. 完善的归档制度，定期检查归档情况。**

建议阜康市教育局**一是**明确项目资料归档的责任主体、归档范围、归档时间等要求，确保项目资料归档工作的规范进行；**二是**定期对项目资料归档情况进行检查，查漏补缺，发现问题及时整改，确保项目资料的完整归档。

### **3. 制定资产计划，优化资产流程。**

建议阜康市教育局**一是**明确资产管理责任主体、管理流程、资产登记和核算要求等，确保资产管理工作的规范进行；**二是**简化资产登记和核算流程，提高资产核算效率，确保项目资产在规定时间内完成登记和核算。

### **4. 提高沟通协调能力，加强项目风险管理。**

建议阜康市教育局，在以后开展类似项目时，**一是**项目各方要加强沟通协调，特别是对于验收环节，要提前与相关部门和单位进行沟通，确保验收工作的顺利进行；**二是要**加强项目风险管理，特别是对于可能影响项目进度的问题，要提前进行风险评估，并制定相应的应对策略。

## **5. 加强项目监控。**

加强对项目的监控，对于可能影响项目产出的因素，要及时进行预警，及时调整绩效目标，以防年底自评时产生偏差，并采取措施进行解决。

## **八、绩效评价结果应用建议**

本项目绩效评价结果为“优”，从绩效管理方面来看，阜康市教育局绩效目标、绩效监控、绩效自评完成情况较好。因此，我司对本项目评价结果提出以下建议：

### **（一）对评价中发现的问题进行整改**

建议阜康市教育局对标对表、拉单列表，及时研究制定整改措施，确定整改期限，积极整改，加强制度建设，健全完善资金管理、项目管理和绩效管理等相关制度和办法，按期完成整改任务。

### **（二）下一年度预算安排**

建议根据自治区及阜康市关于预算绩效管理相关政策要求，将本次重点项目绩效评价结果作为阜康市教育局次年类似资金安排的参考依据，逐步健全绩效管理激励约束机制，促使部门履行好预算绩效管理的主体责任，促进阜康市教育局的预算编制更精准更科学更完整，绩效目标设置更明确更细化更全面，切实提高财政资源配置效率和使用效率。

### **（三）评价结果公开**

建议按照政府信息公开等有关要求，遵循“谁组织实施、谁进行公开”的原则，根据上级统一部署，对绩效评价结果采取适度公开，不断提升绩效评价社会参与度。

## 九、其他需说明的问题

### （一）关于评价责任的说明

1. 阜康市教育局提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价结论的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，项目绩效评价工作组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，项目绩效评价工作组只能在上述单位提供现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

2. 我司与委托方和预算单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，项目绩效评价工作组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

### （二）本次绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“定量指标体系的打分评价”+“定性调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标体系的设计与评价指标设置的完整性、

科学合理程度会影响评价结果的全面性。

本次绩效评价相关附件目录如下：

附件 1：综合评分表

附件 2：基础数据表

附件 3：访谈记录

附件 4：满意度调查问卷结果分析报告以及调查问卷样表

附件 5：项目调研照片

附件 6：绩效评价报告征求部门意见反馈

附件 7：项目单位自评表

第三方评价机构全称（盖章）

法定代表人（签字）：

2024 年 7 月 26 日



附件 1：综合评分表

2023 年阜康市智慧校园二期建设项目指标体系												
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标解释	标杆 值	评价 依据	评分标准	数据获 取方式	评分过程	扣 分	得 分	得分 率
项目 决策 (10 )	项目 立项 (3)	立项 依据 充分 性	1.5	项目立项是否符合法律 法规、相关政策、发展规 划以及部门职责，用以反 映和考核项目立项依据 情况。	充分	通用 标准	①项目立项是否符合 国家法律法规、国民 经济发展规划和相关 政策；②项目立项是 否符合行业发展规划 和政策要求；③项目 立项是否与部门职责 范围相符，属于部门 履职所需；④项目是 否属于公共财政支持 范围，是否符合中央、 地方事权支出责任划 分原则；⑤项目是否 与相关部门同类项目 或部门内部相关项目 重复。以上每条要素 占权重分的 20%，每有 一条不符合，扣除对 应权重分，扣完为止。	政策文 件	①项目立项依据根据《教育部 关于印发<教育信息化 2.0 行动计划>的通知》（教技 〔2018〕6 号）、《加快推进 教育现代化实施方案 （2018-2022 年）》《关于昌 吉州阜康市智慧校园二期建 设项目可行性研究报告的批 复》（阜发改投资〔2021〕146 号）、《关于下达 2023 年自 治区第一批地方政府债券转 贷资金的通知》（昌州财预 〔2023〕9 号），符合国相关 政策及发展规划；②与阜康市 教育局“负责全市各级各类教 育的统筹规划和综合协调，负 责市各级各类学校的校舍建 设及各项配套设施建设；负责 中小学信息化建设及远程教 育工作；负责统筹中小学实验 教学和实验室规范化建设及 信息化装备，指导中小学做好	0	1.5	100%

									各类实验室、专用教室、教学仪器、电教器材、教学设备的管理和使用工作。综合管理全市基础教育工作；” 的部门职责范围相符，属于部门履职所需。③项目符合公共财政支持范围。④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 综上所述，该指标满分 1.5 分，得分 1.5 分。			
		立项程序规范性	1.5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上每条要素占权重分的 1/3，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	政策文件	项目属于信息化建设类项目，属于财政支持范围。评价小组通过核查《关于申请昌吉州阜康市智慧校园建设项目二期可研批复的函》《关于昌吉州阜康市智慧校园二期建设项目可行性研究报告的批复》（阜发改投资〔2021〕146 号）《关于下达 2023 年自治区第一批地方政府债券转贷资金的通知》（昌州财预〔2023〕9 号），认为项目符合立项程序，项目申请及审批文件，提交的文件、资料均符合相关要求，提交的材料充分，同时也具有较高的真实性，项目审批文件材料符合相关要求。项目通过《阜康市项目工作领导小	0	1.5	100%



									组会议纪要》（阜项目领导小组〔2022〕1号），项目经过必要的集体决策。 综上所述,该指标满分 1.5 分，得分 1.5 分。			
绩效 目标 (3)	绩效 目标 合理 性	1.5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	通用 标准	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	绩效目 标表	阜康市教育局按照预算绩效管理要求编制了《项目支出绩效目标表》，根据设定的绩效目标表，项目绩效目标符合相关法律法规、行业中长期规划，与实际工作内容具有相关性，与项目预算资金量相匹配。 综上所述,该指标满分 1.5 分，得分 1.5 分。	0	1.5	100%	
	绩效 指标 明确 性	1.5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	通用 标准	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上每条要素各占权重的 1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	绩效目 标表	根据项目《项目支出绩效目标表》可知，阜康市教育局将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，该项目共设置 11 条绩效指标，其中有 9 条绩效指标已量化，指标量化率达到 81.82%，满足了量化指标需占指标总数 70% 及以上的规范要求，并满足三级指标≥7 条的基本要求，指	0	1.5	100%	

									标值设立依据、分值权重、赋分规则及佐证资料等的填报符合《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）及《关于印发自治区项目支出绩效目标设置指引的通知》（新财预〔2022〕42号）文件的要求。综上所述，该指标满分1.5分，得分1.5分。			
	资金投入 (4)	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	通用标准	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	预算批复	项目预算编制依据项目立项批复、项目可行性研究报告以及《关于下达2023年自治区第一批地方政府债券转贷资金的通知》（昌州财预〔2023〕9号），可行性研究报告中工程概算中的软、硬件购置费参考类似产品市场价格和厂商询价，但项目2023年预算总额为2000万元，而项目确定的总投资为2600万元，项目预算编制未含其配套资金，预算编制不够完整，扣除0.5分。综上所述，该指标满分2分，扣0.5分，得分1.5分。	0.5	1.5	75%

		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	通用标准	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	预算批复文件、政策文件	项目预算资金的分配是依据《关于下达 2023 年自治区第一批地方政府债券转贷资金的通知》（昌州财预〔2023〕9 号）等文件，资金支付按照项目工程总承包合同中施工进度付款，资金分配数额按项目预算数额分配，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。	0	2	100%
项目过程（25）	资金管理（10）	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	通用标准	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率=100%，得权重分满分，每降低 1%，扣除 1%权重分，扣完为止。	核查项目资料	根据核查《关于下达 2023 年自治区第一批地方政府债券转贷资金的通知》（昌州财预〔2023〕9 号），2023 年 2 月 13 日到位一般债券资金 2000 万元，故资金到位率=（2000/2000）×100%=100%。综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。	0	3	100%
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	通用标准	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。预算执行率=100%，得权重分满分，每降低 1%，扣除 1%权重分，扣完为止。	预算批复文件	根据阜康市教育局提供的支付凭证，截止至 2023 年 12 月 31 日，共计支出 2000 万元。（2000/2000）×100%=100%。综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。	0	3	100%

		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	通用标准	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上每条指标各占权重分的25%，要素①②不符合，扣除对应权重分；要素③④不符合属于重大违纪，该指标不得分。	资金支付凭证、财务管理办法	经核查相关资金支付凭证，该项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 综上所述，该指标满分4分，得分4分。	0	4	100%
	组织实施（15）	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	制度汇编	阜康市教育局遵照《中华人民共和国预算法》《内控管理制度》等文件的要求，制定了相应的固定资产管理制度、合同管理内部控制制度、货币资金管理制度、建设项目管理制度、收支管理内部控制制度、无形资产管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度。财务和业务管理制度合法、合规。但未针对制定贴合阜康市教育局2023年阜康市智慧校园二期建设项目的实施制度	1	2	66.67%

								和管理制度，故扣 1 分。 综上所述，该指标满分 3 分， 扣 1 分，得分 2 分。			
	制度 执行 有效 性	3	项目实施是否符合相关 管理规定，用以反映和考 核相关管理制度的有效 执行情况。	有效	通用 标准	①是否遵守相关法律 法规和相关管理规 定；②项目调整及支 出调整手续是否完 备；③项目合同书、 验收报告、技术鉴定 等资料是否齐全并及 时归档；④项目实施 的人员条件、场地设 备、信息支撑等是否 落实到位。以上每条 要素各占权重的 25%， 每有一条不符合，扣 除对应的权重分，扣 完为止。	支付凭 证、档 案资料	通过核查项目资料，项目付款 凭证、项目实施过程资料、招 投标等资料保存完整健全，项 目实施的人员条件、场地设 备、信息支撑等均已落到 位。但发现项目资金到位文件 《关于下达 2023 年自治区第 一批地方政府债券转贷资金 的通知》（昌州财预〔2023〕 9 号）未及时归档，故扣除 0.75 分。 综上所述，该指标满分 3 分， 扣 0.75 分，得分 2.25 分。	0.7 5	2.2 5	75%
	工程 变更 规范 性	3	是否建立有完善的授权 签证制度(含重大变更报 批制度)，各类工程变更 手续是否齐全，用以反映 和考核工程变更的规范 性	规范	通用 标准	①工程变更理由与条 件是否合理； ②工程变更是否经由 规范流程审核、批准； ③工程变更的图纸设 计要求和深度是否等 同原设计文件； ④工程变更设计是否 审核批准后进行施 工。 以上每一点不符合扣	项目批 复、工 程变更 资料	通过核查资料及访谈，项目不 存在重大变更。 综上所述，该指标满分 3 分， 得分 3 分。	0	3	100%

						1 分，扣完为止。						
	项目资产管理规范性	3	项目竣工后是否按照国有资产管理规定履行资产备案和产权登记	规范	通用标准	①是否履行资产备案和产权登记； ②是否按照资产管理要求，明确债券项目中涉及的政府资产的产权归属、管理与移交方案等。 每发现一条问题扣 50%分，扣完为止。	项目资料、访谈	通过核查项目资料，项目于 2023 年 7 月 4 日正式完成验收，且于 2023 年 7 月 15 日完成竣工财务决算，项目已编制交付资产使用表，但截至评价节点，项目固定资产尚未录入系统，较为缓慢，扣除 1.5 分。综上所述，该指标满分 3 分，扣 1.5 分，分 1.5 分。	1.5	1.5	50%	
	债务信息公开完备性	2	是否公开债务项目信息，公开内容是否完整、规范	完备	通用标准	①是否公开债务项目存续期的重大事项，包括债券资金使用情况、项目建设进度等； ②若为专项债项目，是否对实施方案中自平衡测算的调整进行披露； ③项目进度是否根据原计划进行，若有延迟，是否进行披露。 每发现一条问题扣 1 分，扣完为止。	信息公开网站、访谈	根据核查债务公开信息，阜康市财政局按照《自治区地方政府债务信息公开办法》中”第十条【一般债券存续期公开】地县财政部门应当组织开展本地区对级一般债券存续期信息公开工作，督促和指导使用一般债券资金的部门不迟于每年 5 月底前公开”对项目的债务信息公开。 综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。	0	2	100%	
	债务偿还率	1	是否及时、足额偿还债务本息，反映债券本息偿还计划执行情况	=100%	通用标准	债务偿还率=一定时期（本年度或项目建设期）内实际偿还债务本息额/一定时期（本年度或项目建设	项目资料、访谈	通过核查项目资金到位文件及访谈，项目资金来源主要为一般债券资金，其还款来源为阜康市财政还款，故债务偿还率为 100%。	0	1	100%	

							期)内应偿还债务本息额。 债务偿还率 100%得满分, 否则不得分。		综上所述,该指标满分 2.5 分, 得分 2.5 分。			
产出 (35)	产出 数量 (15)	智慧 校园 信息 化建 设教 学点 数	6	项目实施的实际产出数 与计划产出数的比率, 用 以反映和考核项目产出 数量目标的实现程度。	≥34 所	计划 标准	实际完成率=(实际产 出数/计划产出数)× 100%。实际完成率 =100%, 得 100%权重 分, 业绩值每降低 1%, 扣除 5%权重分, 扣完 为止。	发放 表、支 付凭证	通过核查项目竣工验收报告, 项目于 2023 年 7 月 4 日正式 完成验收, 其中验收内容“阜 康市职业中等专业学校共 240 间教室建设电子督学教室, 部 署电子督学前端设备。”由于 乡村幼儿园撤并的原因, 共计 完成 31 所教学点。完成率= (31/34)*100%=91.18%, 扣除 2.65 分。 综上所述, 该指标满分 6 分, 扣除 2.65 分, 得分 3.35 分。	2.6 5	3.3 5	55.8 3%
		建设 智慧 幼儿 园完 成率	5	项目实施的实际产出数 与计划产出数的比率, 用 以反映和考核项目产出 数量目标的实现程度。	=100%	计划 标准	实际完成率=(实际产 出数/计划产出数)× 100%。实际完成率 =100%, 得 100%权重 分, 业绩值每降低 1%, 扣除 5%权重分, 扣完 为止。	发放 表、支 付凭证	通过核查项目竣工验收报告, 项目于 2023 年 7 月 4 日正式 完成验收, 建设智慧幼儿园完 成率达到 100%。 综上所述, 该指标满分 5 分, 得分 5 分。	0	5	100%
		新建 智慧 校园 数据 中台 完成	4	项目实施的实际产出数 与计划产出数的比率, 用 以反映和考核项目产出 数量目标的实现程度。	=100%	计划 标准	实际完成率=(实际产 出数/计划产出数)× 100%。实际完成率 =100%, 得 100%权重 分, 业绩值每降低 1%, 扣除 5%权重分, 扣完		通过核查项目竣工验收报告, 项目于 2023 年 7 月 4 日正式 完成验收, 新建智慧校园数据 中台完成率达到 100%。 综上所述, 该指标满分 4 分, 得分 4 分。	0	4	100%

		率					为止。					
产出质量 (8)	项目竣工验收合格率	3	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	=100%	计划标准	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率=100%，得 100%权重分，业绩值每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	竣工验收报告	通过核查项目竣工验收报告，项目于 2023 年 7 月 4 日正式完成验收，项目整体验收结论为合格。 综上所述，该指标满分 4 分，得分 4 分。	0	3	100%	
	设施设备采购质量合格率	2	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	=100%	计划标准	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率=100%，得 100%权重分，业绩值每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	竣工验收报告	通过核查项目竣工验收报告，项目于 2023 年 7 月 4 日正式完成验收，其中完成电子督学前端设备、智慧照明护眼灯、机房设备、测光验光设备、网络下沉 OLT 等设备验收，验收结论为合格。 综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。	0	2	100%	
	建设信息设备安全等级	3	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	二级	计划标准	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率=100%，得 100%权重分，业绩值每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	竣工验收报告	通过核查项目竣工验收报告，项目于 2023 年 7 月 4 日正式完成验收，其中验收内容中“4、建设信息安全设备，满足督学平台信息安全等级保护二级要求。”，验收结论为合格。 综上所述，该指标满分 4 分，	0	3	100%	



									得分 4 分。			
产出 时效 (6)	项目 资金 支付 及时 率	2	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	=100%	计划 标准	达到标杆值得 100%权重分, 否则每推后一天, 扣除 1%权重分, 扣完为止。	资金支 付凭 证、工 程总承 包合同	根据核查项目支付凭证, 资金支付按照项目工程总承包合同中施工进度付款, 资金支付及时。 综上所述, 该指标满分 2 分, 得分 2 分。	0	2	100%	
	项目 按计 划完 工率	4	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	=100%	计划 标准	达到标杆值得 100%权重分, 否则每推后一天, 扣除 1%权重分, 扣完为止。	工程总 承包合 同、竣 工验收 报告	根据核查项目工程总承包合同, 项目计划 2023 年 6 月 7 日竣工, 但通过核查项目竣工验收报告, 项目由于各个学校的验收点较为分散, 最终于 2023 年 7 月 4 日竣工验收, 共计推后 27 天, 故扣除 1.08 分。 综上所述, 该指标满分 6 分, 扣 1.08 分, 得分 2.92 分。	1.0 8	2.9 2	73%	
产出 成本 (6)	项目 成本 控制 率	6	完成项目计划工作目标的实际支出与计划预算金额的比率, 用以反映和考核项目的预算控制程度。	=100%	计划 标准	达到标杆值得 100%权重分, 否则每推后一天, 扣除 1%权重分, 扣完为止。	合同、 竣工财 务决算 报告	根据核查项目工程总承包合同, 合同价为 2159.8 万元, 通过核查《昌吉州阜康市智慧校园二期建设项目竣工财务决算审核报告》中工程造价审定金额为 2159.79 万元, 故项目最终审定价未超出合同价, 且未超出项目总投资 2600 万元。 综上所述, 该指标满分 6 分,	0	6	100%	

									得分 6 分。			
效益 (30)	社会效益 指标 (20)	提升 学生 学习 和教 学质 量	6	项目实施所产生的社会 效益。	提高	计划 标准	达到标杆值，得权重 分的 100%，否则按照 比例得分。	问卷调 查	根据项目满意度问卷调查，回 收有效问卷共 82 份，对于问 题“第 6 题：您认为电子督学 是否能提升学生学习和教学 质量？”认为“能”69 人，“不 确定”13 人，故该项完成率为 96.83%，扣除 0.19 分。 综上所述，该指标满分 6 分， 扣 0.19 分，得分 5.81 分。	0.1 9	5.8 1	96.8 3%
		长期 构建 精准 学 习、 精准 管 理、 精准 教 学 的 智 慧 校 园 生 态	4	项目实施所产生的社会 效益。	长期	计划 标准	达到标杆值，得权重 分的 100%，否则按照 比例得分。	问卷调 查	根据项目满意度问卷调查，回 收有效问卷共 82 份，对于问 题“第 12 题：您认为项目的 建设能否长期构建精准学习、 精准管理、精准教学的智慧校 园生态？”认为“能”75 人， “不确定”7 人，故该项完成 率为 98.29%，扣除 0.07 分。 综上所述，该指标满分 4 分， 扣 0.07 分，得分 3.93 分。	0.0 7	3.9 3	98.2 5%

		教育信息资源合理有效配置	6	项目实施所产生的社会效益。	促进	计划标准	达到标杆值，得权重分的 100%，否则按照比例得分。	问卷调查	根据项目满意度问卷调查，回收有效问卷共 82 份，对于问题“第 9 题：您认为项目的实施是否能使阜康市教育信息资源得到合理的有效配置？”认为“能”72 人，“不确定”10 人，故该项完成率为 97.56%，扣除 0.15 分。综上所述，该指标满分 6 分，扣 0.15 分，得分 5.85 分。	0.15	5.85	97.50%
		教育信息化师资队伍建设	4	项目实施所产生的社会效益。	加强	计划标准	达到标杆值，得权重分的 100%，否则按照比例得分。	问卷调查	根据项目满意度问卷调查，回收有效问卷共 82 份，对于问题“第 10 题：您认为项目的实施是否能加强教育信息化的师资队伍建设？”认为“能”72 人，“不确定”10 人，故该项完成率为 97.56%，扣除 0.1 分。综上所述，该指标满分 6 分，扣 0.1 分，得分 3.9 分。	0.1	3.9	97.50%
	满意度指标（10）	教师满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥90%	计划标准	达到标杆值，得权重分的 100%，否则每下降 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	问卷调查	根据项目满意度问卷调查，回收教师满意度有效问卷共 52 份，对于问题“第 15 题：您对智慧校园二期建设项目的整体规划是否满意？”其中选择非常满意 35 人，比较满意 15 人，故教师满意度为	0	5	100%

									90.38%。 综上所述，该指标满分 5 分， 得分 5 分。			
		学生 满意度	5	社会公众或服务对象对 项目实施效果的满意程 度。	≥90%	计划 标准	达到标杆值，得权重 分的 100%，否则每下 降 1%，扣除 5%权重分， 扣完为止。	问卷调 查	根据项目满意度问卷调查，回 收学生满意度有效问卷共 30 份，对于问题“第 14 题：您 对教室中的护眼灯的使用效 果是否满意？是否能起到护 眼效果？”其中选择非常满意 19 人，比较满意 9 人，故学生 满意度为 87.33%，扣除 0.67 分。 综上所述，该指标满分 5 分， 扣 0.67 分，得分 4.33 分。	0.6 7	4.3 3	86.6 0%
总分	100		100							8.6 6	91. 34	91.3 4%

附件 2：基础数据表

附件 2：基础数据表

1. 项目实施规模与完成情况一览表

项目单位 (盖章)：阜康市教育局			
序号	项目名称	项目批复建设内容及规模	完成情况
1	2023 年阜康市智慧校园二期建设项目	对阜康市 34 所幼儿园、分园、教学点进行智慧校园信息化建设;建设智慧幼儿园(包括电子督学室设备、智慧照明系统);新建智慧校园数据中台等。	截至 2023 年 12 月 31 日, (1) 阜康市 16 所幼儿园、14 所幼儿园分园(含分园和教学点)、阜康市职业中等专业学校共 240 间教室建设电子督学教室, 部署电子督学前端设备。(2) 在 16 所幼儿园、2 所幼儿园分园、阜康市职业中等专业学校建立督学室, 进行巡课督学。(3) 阜康市 15 所幼儿园、14 所幼儿园分园(含分园和教学点)、阜康市第二中学、阜康市九运街中小学、阜康市天龙小学、阜康市淤泥泉子镇中心小学和阜康市职业中等专业学校共 349 间教室建设智慧照明教室。(4) 建设信息安全设备, 满足督学平台信息安全等级保护二级要求。(5) 租用阜康电信机房空间, 原教育局服务器等设备搬迁至阜康电信机房, 满足督学平台信息安全等级保护二级要求对机房环境的要求。(6) 租用阜康电信机房空间至教育局机房光纤链路, 满足原教育局机房内设备搬迁至阜康电信机房数据通信需求。(7) 提供运营商 OLT 下沉至学校服务, 共 18 套 OLT 下沉服务, 覆盖阜康市中小学。(8) 测光验光设备 18 套, 包括 18 套测光仪、18 套验光设备及 18 套验光专用配套桌椅。(9) 阜康市教育局建设标准化考场指挥中心、试卷库等。(10) 阜康市第一中学建设标准化考场 60 间、一中分中心、考场大屏等。(11) 阜康市第二中学建设标准化考场 40 间、二中分中心。

2. 项目合同金额与支出情况

项目单位 (盖章)：阜康市教育局				
序号	标段名称	合同价金额 (万元)	截至 2023 年 12 月 31 日支出金额 (万元)	截至 2024 年 7 月 31 日支出金额 (万元)
1	2023 年阜康市智慧校园二期建设项目	2159.8	2000	159.79

## 附件 3：访谈记录

### 2023 年阜康市智慧校园二期建设项目 访谈记录

#### 一、访谈背景

##### （一）访谈目的

本次绩效评价访谈调研旨在通过现场访谈，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为 2023 年阜康市智慧校园二期建设项目的建言献策。

##### （二）访谈对象和访谈内容

###### 1. 访谈对象

项目主管部门：阜康市教育局

###### 2. 访谈内容

（1）项目的立项时间、设立的背景、目的和政策依据、项目的实施开展情况、项目的预算资金的资金来源、安排及执行情况、项目具体的实施内容。（2）项目实施过程中未采取的监督、管理措施来保证项目的有效实施。（3）项目在开展过程中遇到过问题或难点。

#### 二、访谈分析

##### （一）项目设立背景及目的

当前，云计算、大数据、物联网、移动计算等新技术逐步广泛应用，经济社会各行业信息化步伐不断加快，社会整体信息化程度不断加深，信息技术对教育的革命性影响日趋明显。

“十四五”期间，全面提升教育质量、在更高层次上促进教育公平、加快推进教育现代化进程等重要任务对教育信息化提出了更高要求，也为教育信息化提供了更为广阔的发展空间。

阜康市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要指出：建立高质量教育体系，推进“互联网+教育”发展。构建“互联网+教育”支撑服务体系，发挥教育云平台、云课堂、教育城域网功能，促进信息技术与教育教学深度融合。加快教育城域网建设，实现“三个课堂”在中小学常态化供给应用。推进数字校园、智慧校园建设与应用，促进课堂学习与课外学习、真实环境与虚拟环境、线上学习与线下学习有机结合，推动教育信息化应用覆盖全体师生和全部学科。积极与山西省共建远程教育资源共享平台，促进优质教育资源共享

为进一步建设智慧校园对于促进教师和学生尽快提高应用信息技术的水平,促进学校教学改革，推行素质教育，促进教学手段的现代化水平，全面提高幼儿园及学校现代化管理水平，加强学校与外界交流等方面都具有重要作用。阜康市在区、州党委、政府的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大和十九届一中、二中全会精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持把教育摆在优先发展的战略地位，高质量推进教育均衡发展，促进了全市教育质量的不断提升，为此启动“昌吉州阜康市智慧校园二期建设项目”。

## （二）项目具体实施内容

对阜康市 34 所幼儿园、分园、教学点进行智慧校园信息化建设；建设智慧幼儿园（包括电子督学设备、智慧照明系统）；建设智慧校园数据平台等。具体为：

1. 配备 240 间教室电子督学前端设备、电子督学室。

2. 配备 349 间校园智能照明教室。

3. 18 套学校智能测光验光设备。

4. 阜康市一中、阜康市二中共 100 间标准化考场。

5. 教育局网格平台、教育局网络安全、运营商 OLT 改造、运营商托管机房机架租赁、运营商机房链路租用等。

## （三）项目完成情况

目前项目已完工，已于 2023 年 7 月完成验收，已完成竣工结算审计和财务决算审计工作。

## （四）项目资金安排及使用情况

该项目为地方一般债券项目，计划投资 2600 万元，资金来源：其中 2000 万为地方一般债券资金，600 万为市财政配套资金。项目中标价 2159.8 万元，审计定案价 2159.788673 万元。已累计支付 100%工程款。

## （五）项目组织情况（领导小组）

本项目自 2021 年 11 月 12 日经《关于〈昌吉州阜康市智慧校园二期建设项目可行性研究报告〉的批复》（阜发改投资〔2021〕146 号）文件批复，经阜康市项目工作领导小组会议，



确定了项目领导小组，明确了责任分工：

组长:郑东育（教育局书记）

副组长：李伟（教育局局长）

项目负责人：刘军（教育局副局长）

组员：张鹏飞（项目装备办负责人）、白冰洋（项目装备办科员）、徐敏（计财科主任）

其中：李伟负责统筹工作，张鹏飞负责项目日常监管工作，白冰洋负责项目档案资料，徐敏负责资金拨付工作。

#### **（六）项目实施过程中遇到的困难及应对策略**

无。

#### **（七）项目开展过程中积累的经验做法以及下一步的工作规划**

计划实施 2024 年阜康市教育系统智慧校园三期建设项目，为新建阜康市晋康小学、城西幼儿园提供信息化服务。

## 附件 4：满意度调查问卷结果分析报告以及调查问卷样表

### 2023 年阜康市智慧校园二期建设项目满意度调查问卷 结果分析报告

#### 一、满意度调查背景

本次绩效评价社会调研旨在了解项目完成后的社会效益与受访人员满意度，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为 2023 年阜康市智慧校园二期建设项目的开展建言献策。

#### 二、研究设计

##### （一）调研对象

本次问卷调查的对象为阜康市教师及学生。

##### （二）调研内容

1. 调查对象的基本信息，包括：调查对象的姓名、联系方式等基本情况。

2. 调查受访人员对 2023 年阜康市智慧校园二期建设项目的知晓程度。

3. 调查受访人员对 2023 年阜康市智慧校园二期建设项目实施后带来的效益情况。

4. 调查受访人员对 2023 年阜康市智慧校园二期建设项目

的满意度。

5. 调查受访人员对 2023 年阜康市智慧校园二期建设项目的意见及建议。

### （三）调研方法

本次调研采用简单随机抽样法，针对 2023 年阜康市智慧校园二期建设项目受益人员，对参观阜康市教师及学生开展问卷调查。

### （四）抽样方式

本次问卷调查采用线上发放的方法，通过“二维码”或“快捷链接”进行网上答卷。

### （五）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由我公司工作人员组织安排问卷调查工作。

## 三、调研实施

### （一）调研开展情况

根据项目进度安排，项目组于 2024 年 7 月 8 日至 2023 年 7 月 20 日，对阜康市残疾人的社会公众问卷的发放与回收。

### （二）问卷回收情况


由于问卷发放时间正值暑期，问卷下发难以回收，故截至 2024 年 7 月 20 日，2023 年阜康市智慧校园二期建设项目问卷调研实际发放 300 份，本次共回收 82 份问卷，有效问卷达 82

份，有效率 100%。

#### 四、调查结果分析

第 1 题问卷填报完成后的【抽奖活动】弹窗为平台广告推送，为避免误购广告商品造成财产损失，请勿点击！[\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
我已知悉！	82	<div><div></div></div> 100%
本题有效填写人次	82	

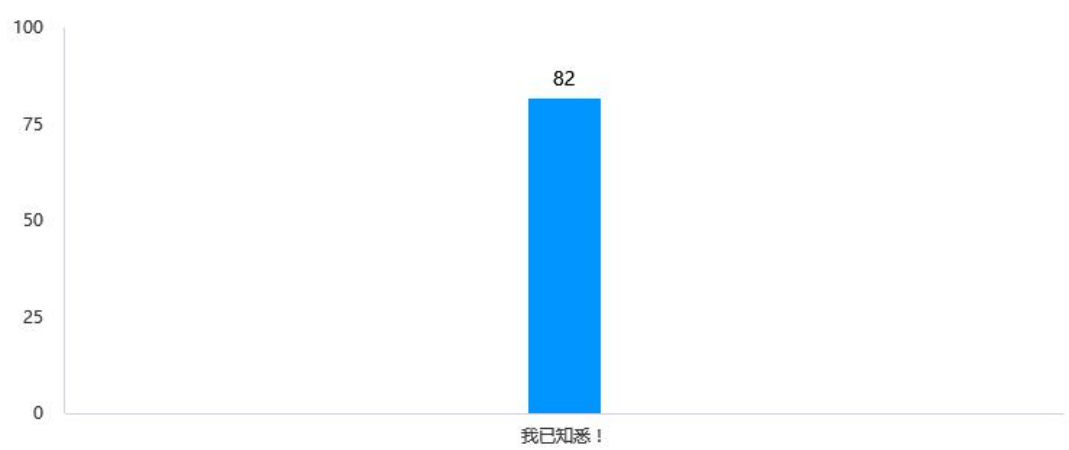

第 2 题您的姓名[\[填空题\]](#)


填空题数据请通过下载详细数据获取

第 3 题您的联系方式[\[填空题\]](#)

填空题数据请通过下载详细数据获取


第 4 题您的身份？[\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
学生	30	<div><div></div></div> 36.59%
教师	52	<div><div></div></div> 63.41%
本题有效填写人次	82	

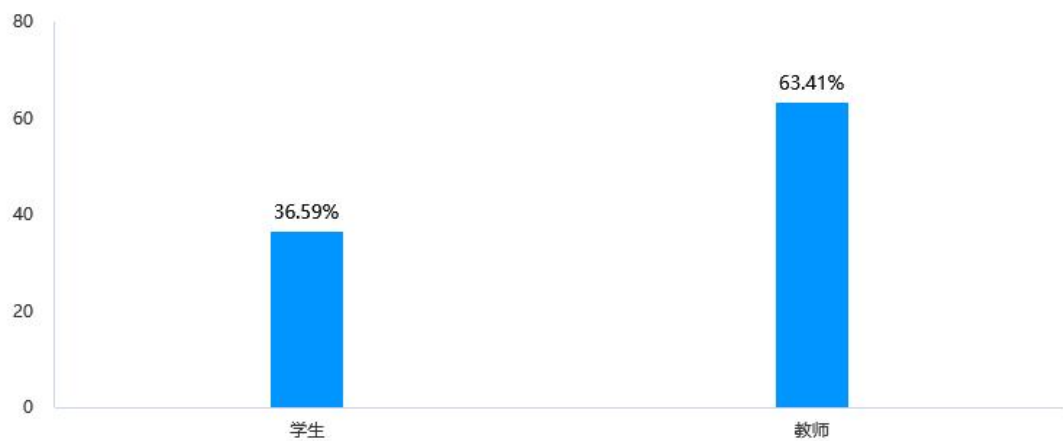

第 5 题您认为标准化考场的建设是否有必要？能否提高监考效率？[单选题]

选项	小计	比例
有必要	77	93.9%
不确定	4	4.88%
没必要	1	1.22%
本题有效填写人次	82	

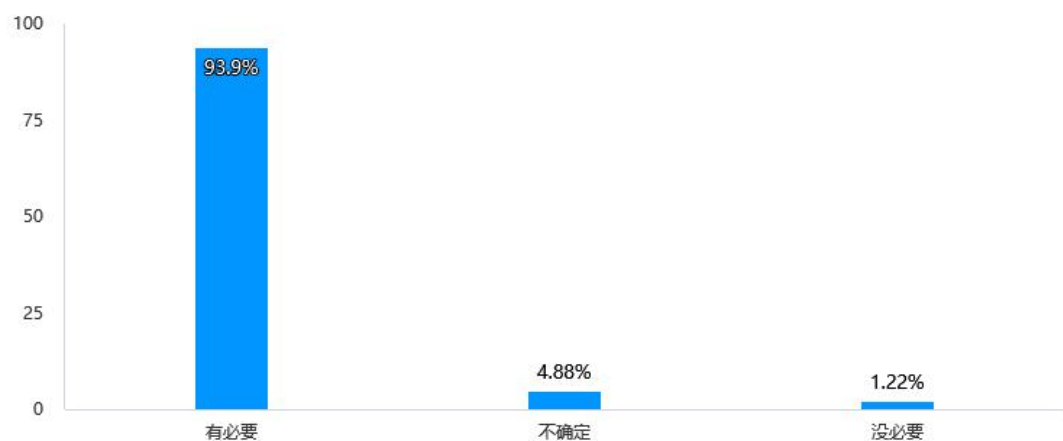


第 6 题您认为电子督学是否能提升学生学习和教学质量？[单选题]

选项	小计	比例
A.能	69	<div><div></div></div> 84.15%
B.不能	0	<div><div></div></div> 0%
C.不确定	13	<div><div></div></div> 15.85%
本题有效填写人次	82	




第 7 题您认为智慧校园二期建设项目中的智能化设备是否能提高校园管理效率？[单选题]

选项	小计	比例
A.肯定能	62	<div><div></div></div> 75.61%
B.可能能	11	<div><div></div></div> 13.41%
C.不确定	8	<div><div></div></div> 9.76%
D.可能不能	1	<div><div></div></div> 1.22%
E.肯定不能	0	<div><div></div></div> 0%
本题有效填写人次	82	

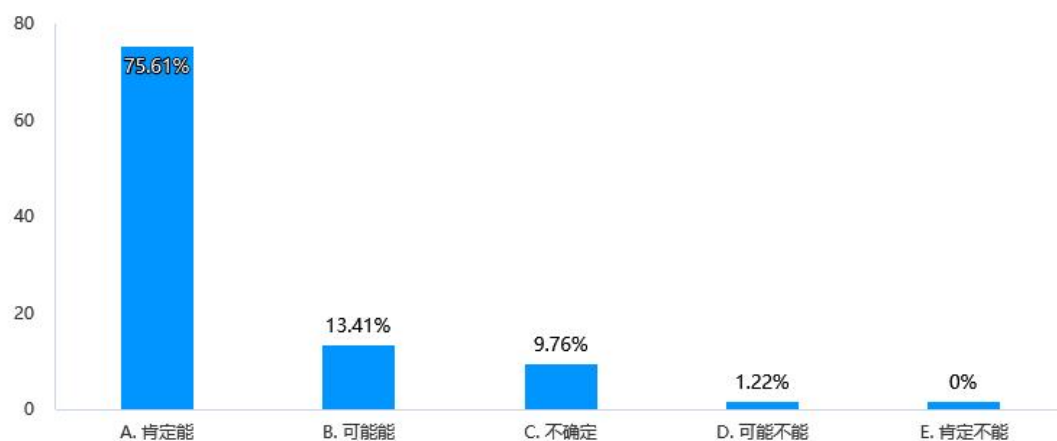

第 8 题您对智慧校园二期建设项目的信息安全保障措施有何看法？[单选题]

选项	小计	比例
A.非常放心	54	<div><div></div></div> 65.85%
B.比较放心	21	<div><div></div></div> 25.61%
C.一般	6	<div><div></div></div> 7.32%
D.不太放心	1	<div><div></div></div> 1.22%
E.完全不放	0	<div><div></div></div> 0%
本题有效填写人次	82	

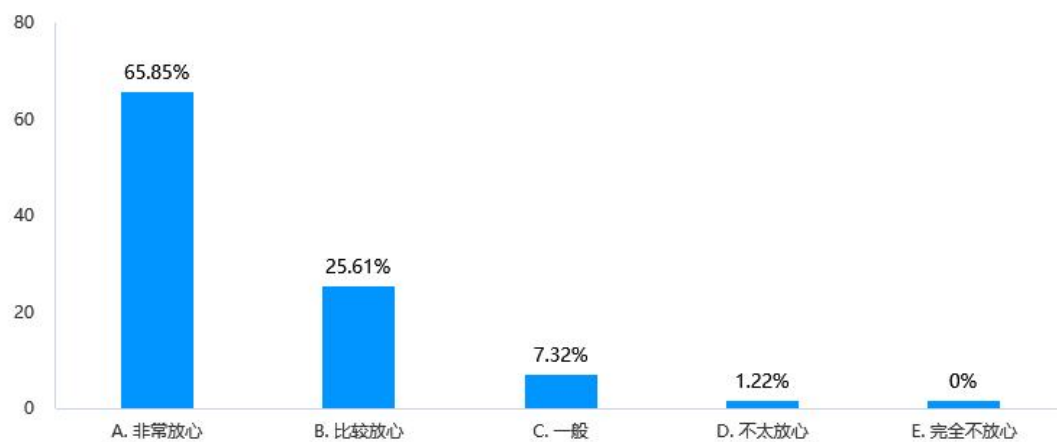

第 9 题您认为项目的实施是否能使阜康市教育信息资源得到合理的有效配置？[单选题]

选项	小计	比例
能	72	<div><div></div></div> 87.8%
不确定	10	<div><div></div></div> 12.2%
不能	0	<div><div></div></div> 0%
本题有效填写人次	82	



第 10 题您认为项目的实施是否能加强教育信息化的师资队伍建设？[单选题]

选项	小计	比例
能	72	<div><div></div></div> 87.8%
不确定	10	<div><div></div></div> 12.2%
不能	0	<div><div></div></div> 0%
本题有效填写人次	82	



## 调查问卷样表

### 阜康市 2023 年阜康市智慧校园二期建设项目

尊敬的先生/女士:

您好!受阜康市财政局委托,我公司对阜康市 2023 年阜康市智慧校园二期建设项目的情况展开调研,感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 3 分钟,请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析,对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合!

新疆谱诚项目管理咨询有限公司

2024 年 7 月

1.问卷填报完成后的【抽奖活动】弹窗为平台广告推送,为避免误购广告商品造成财产损失,请勿点击! [单选题]\*

☐我已知悉!

2.您的姓名[填空题]\*

---

3.您的联系方式[填空题]\*

---

4.您的身份? [单选题]\*

☐学生

☐教师

5.您认为标准化考场的建设是否有必要? 能否提高监考效率? [单选题]\*

☐有必要

☐不确定

☐没必要

6.您认为电子督学是否能提升学生学习和教学质量? [单选题]\*

☐A.能

☐B.不能

☐C.不确定

7.您认为智慧校园二期建设项目中的智能化设备是否能提高校园管理效率？[单选题]\*

- ☐A.肯定能
- ☐B.可能能
- ☐C.不确定
- ☐D.可能不能
- ☐E.肯定不能

8.您对智慧校园二期建设项目的信息安全保障措施有何看法？[单选题]\*

- ☐A.非常放心
- ☐B.比较放心
- ☐C.一般
- ☐D.不太放心
- ☐E.完全不放心

9.您认为项目的实施是否能使阜康市教育信息资源得到合理的有效配置？[单选题]\*

- ☐能
- ☐不确定
- ☐不能

10.您认为项目的实施是否能加强教育信息化的师资队伍建设？[单选题]\*

- ☐能
- ☐不确定
- ☐不能

11.您认为智慧校园二期建设项目中的智能化系统是否能提高教学质量？[单选题]\*

- ☐A.肯定能
- ☐B.可能能

- C.不确定
- D.可能不能
- E.肯定不能

12.您认为项目的建设能否长期构建精准学习、精准管理、精准教学的智慧校园生态? [单选题]\*

- 能
- 不确定
- 不能

13.您认为项目是否能通过网上培训、视频课堂、互动观摩等,提高阜康市相对薄弱学校教师的教学能力,整体提高教育局教育质量? [单选题]\*

- 能
- 不确定
- 不能

14.您对教室中的护眼灯的使用效果是否满意? 是否能起到护眼效果? [单选题]\*

- 非常满意
- 比较满意
- 一般
- 不太满意
- 很不满意

依赖于第 4 题第 1 个选项

15.您对智慧校园二期建设项目的整体规划是否满意? [单选题]\*

- A.非常满意
- B.比较满意
- C.一般
- D.不太满意

○E.很不满意

依赖于第 4 题第 2 个选项

16.您认为智慧校园二期建设项目中哪些方面需要进一步改进？[多选题]\*

☐A.教学设施

☐B.学生活动空间

☐C.绿化环境

☐D.校园安全

☐E.网络覆盖

☐F.其他

17.您对阜康市 2023 年智慧校园二期建设项目有什么建议或诉求？[填空题]\*

---

### 问卷二维码及链接





<https://www.wjx.cn/vm/Q0bgUn2.aspx#>

## 附件 5：项目调研照片





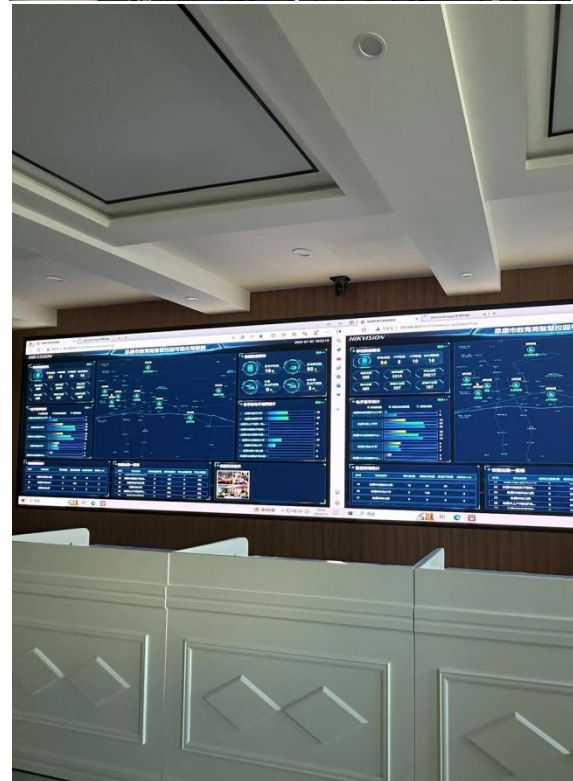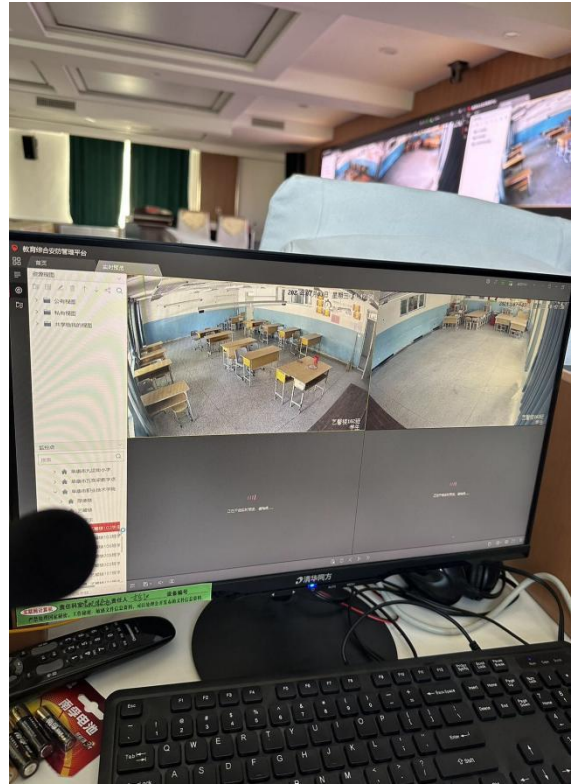











附件 6：绩效评价报告征求部门意见反馈

绩效评价报告征求部门意见反馈表

填表时间：年 月 日

报告名称	2023 年阜康市智慧校园二期建设项目绩效评价报告		
评价机构	新疆谱试项目管 理咨询有限公司	联系人及联系方式	樊欣悦 13669902961
主管部门	阜康市教育局	联系人及联系方式	王玮琪 15199676878
主管 部门意见	<div>无意见</div> <div></div>		

## 附件 7：项目单位报告及自评表

### 2023 年阜康市智慧校园二期建设 项目支出绩效评价报告

项目名称：2023 年阜康市智慧校园二期建设项目

实施单位：阜康市教育局

主管部门：阜康市教育局



## 目录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	5
(一) 绩效评价的目的、对象和范围.....	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准.....	6
(三) 绩效评价工作过程.....	10
三、综合评价情况及评价结论.....	12
四、绩效评价指标分析.....	12
(一) 项目决策情况.....	12
(二) 项目过程情况.....	14
(三) 项目产出情况.....	17
(四) 项目效益情况.....	18
五、预算执行进度与指标偏差.....	20
六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	20
(一) 主要经验及做法.....	20
(二) 存在的问题及原因分析.....	20
七、有关建议.....	21
八、其他需要说明的问题.....	21

## 2023 年阜康市智慧校园二期建设

### 项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况

###### 1. 项目背景

2018 年 4 月 13 日教育部印发的《教育信息化 2.0 行动计划》中明确指出“以人工智能、大数据、物联网等新兴技术为基础，依托各类智能设备及网络，积极开展智慧教育创新研究和示范，推动新技术支持下教育的模式变革和生态重构；构建智慧学习支持环境。加强智慧学习的理论研究与顶层设计，推进技术开发与实践应用，提高人才培养质量。大力推进智能教育，开展以学习者为中心的智能化教学支持环境建设，推动人工智能在教学、管理等方面的全流程应用，利用智能技术加快推动人才培养模式、教学方法改革，探索泛在、灵活、智能的教育教学新环境建设与应用模式。

智慧校园是教育信息化建设的必然阶段，2021 年，阜康市教育局为全面实现教育信息化 2.0，开展了以三课课堂为中心，包含电子督学，德育班牌，互动录播等子系统的阜康市教育综合云平台，该平台的建设，将阜康市下辖中小学及幼儿园进行了全面的信息化水平提升，为各校实现“三全两高一大”目标更近了一步。

为进一步建设智慧校园对于促进教师和学生尽快提高应用信息技术的水平，促进学校教学改革，推行素质教育，促进教学手段的现



代化水平，全面提高幼儿园及学校现代化管理水平，加强学校与外界交流等方面都具有重要作用。阜康市在区、州党委、政府的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大和十九届一中、二中全会精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持把教育摆在优先发展的战略地位，高质量推进教育均衡发展，促进了全市教育质量的不断提升，为此启动“昌吉州阜康市智慧校园二期建设项目”。

## **2. 主要内容及实施情况**

### **主要内容：**

组织实施：本项目自 2021 年 11 月 12 日经《关于〈昌吉州阜康市智慧校园二期建设项目可行性研究报告〉的批复》（阜发改投资〔2021〕146 号）文件批复，经阜康市项目工作领导小组会议，确定了项目领导小组，明确了责任分工：组长为郑东育，副组长为李伟，项目负责人为刘军，组员为张鹏飞、白冰洋、徐敏，其中：李伟负责监管工作，白冰洋负责项目档案资料，徐敏负责资金拨付工作。

本项目已验收并合格，已竣工决算并移交使用。

## **3. 资金投入和使用情况**

### **（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

2023 年阜康市智慧校园二期建设项目预算安排总额为 2000 万元，其中财政资金 2000 万元，其他资金 0 万元，2023 年实际收到预算资金 2000 万元，预算资金到位率为 100%。

### **（2）项目资金实际使用情况分析**

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年阜康市智慧校园二期建设项目实际支付资金 2000 万元，预算执行率 100%。结转结余资金 0 万元，

已上缴国库。项目资金主要用于对阜康市 34 所幼儿园、分园、教学点进行智慧校园信息化建设；建设智慧幼儿园(包括电子督学设备、智慧照明系统)；建设智慧校园数据中心等方面。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 总体目标**

2023 年阜康市智慧校园二期建设项目绩效总体目标为：教育局负责全市各级各类教育的统筹规划和综合协调，负责市各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设。为进一步建设智慧校园对于促进教师和学生尽快提高应用信息技术的水平，我市启动“阜康市智慧校园二期建设项目”，教育局 2023 年计划实施该项目。主要建设内容：对阜康市 34 所幼儿园、分园、教学点进行智慧校园信息化建设；建设智慧幼儿园(包括电子督学设备、智慧照明系统)；建设智慧校园数据中心等 7 个建设项目，工程项目验收合格率预计达到 100%，设施设备采购质量合格率预计达到 100%，财政投入 2000 万元（其中：工程 30%预付款 647.94 万元、80%进度款 1079.9 万元、97%进度款 272.16 万元）用于该项目，资金预计于 2023 年 7 月底前 100%及时支付完毕。项目的实施预计达到促进教育信息资源合理有效配置，加强教育信息化师资队伍建设的成果。

### **2. 阶段性目标**

根据《预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10 号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）、《自治区财政支出绩效评

价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

“项目实施幼儿园、分园、教学点数”指标，预期目标值为 $\geq 34$ 所；

“阜康市智慧校园二期建设项目建设内容数”指标，预期目标值为 $\geq 7$ 个。

②质量指标

“工程项目验收合格率”指标，预期目标值为=100%；

“设施设备采购质量合格率”指标，预期目标值为=100%。

③时效指标

“资金支付及时率”指标，预期目标值为=100%；

“资金支付工作完成时限”指标，预期目标值为2023年7月底前。

（2）成本指标

“阜康市智慧校园二期建设项目工程建设30%预付款”指标，预期目标值为 $\leq 647.94$ 万元；

“阜康市智慧校园二期建设项目工程建设80%进度款”指标，预期目标值为 $\leq 1079.9$ 万元；

“阜康市智慧校园二期建设项目工程建设97%进度款”指标，预期目标值为 $\leq 272.16$ 万元。



### （3）项目效益目标

#### ①经济效益指标

本项目不涉及经济效益指标。

#### ②社会效益指标

“教育信息资源合理有效配置”指标，预期目标值为促进；

“教育信息化师资队伍建设”指标，预期目标值为加强。

#### ③生态效益指标

本项目不涉及生态效益指标。

#### ④可持续影响指标

本项目不涉及可持续影响指标。

#### ⑤满意度指标

本项目不涉及满意度指标。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价的目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、绩效目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

#### 2. 绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2023年度我单位实施的2023年阜康市智慧校园

二期建设项目开展部门绩效评价。

本次绩效评价主要围绕项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，对该专项资金的预算编制、项目实施、监督管理、资金支出使用、绩效目标的实现情况以及受益对象的满意度等开展综合评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

### 1. 绩效评价原则

依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合2023年阜康市智慧校园二期建设项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效

要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2. 绩效评价指标体系及绩效评价标准

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，最终形成了项目绩效评价指标体系，指标体系结构如下（详见上传的附件）：

项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价标准： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价标准： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价标准： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	评价标准： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价标准: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	评价标准: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价标准: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价标准: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价标准: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的计划产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量，既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

### 3. 评价方法

本次绩效评价采用的方法为比较法、因素分析法、公众评判法对项目绩效目标预期目标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对 2023 年阜康市智慧校园二期建设项目进行评价。

### 4. 评价标准

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

### (三) 绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备

##### (1) 成立绩效评价项目小组

为确保该项目绩效评价的顺利实施，评价机构组建了绩效评价项目小组。项目小组负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。

##### (2) 开展前期调研

绩效评价项目小组依据此次绩效评价受委托内容，对拟评价的项目实施前期调研。通过调研对 2023 年阜康市智慧校园二期建设项目实施内容、目标信息、预算信息以及其他的一些项目基本信息，有了初步了解，为制定绩效评价工作方案做好准备。

##### (3) 制订绩效评价工作方案

绩效评价项目小组根据有关规定和评价对象的特点以及前期调研收集的一些信息，拟定详细的绩效评价工作方案。

#### 2. 具体实施

##### (1) 收集基础资料

根据评价工作的需要和要求，在前期调研的基础上，通过多种渠道全面收集项目基础信息资料，主要包括：

①被评价单位基本概况，如单位职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；

②绩效目标及其设立依据和调整情况；

③管理措施及组织实施情况；

④被评价单位总结分析的绩效目标完成情况及绩效报告；

⑤与绩效评价相关的计划标准、行业标准、历史标准等；

⑥其他必要的相关资料等。

## （2）整理、研读基础资料

对收集的基础资料进行分类整理、研读，并对所收集的资料进行核实和全面分析。通过基础资料的整理、研读，了解被评价对象的具体情况，分析被评价对象可能存在的问题，根据工作需要确定实地核查的内容，为现场核查做好准备。

## 3. 分析评价和撰写报告

### （1）综合分析评价

①根据所收集的基础资料，结合现场核查的有关情况，整理出绩效评价所需的项目材料和基础数据。

②将初步评价结论、调整事项、专家咨询意见和有关说明等提交单位内部讨论并征求意见。之后，对所征求的意见及时地进行收集和整理。

### （2）撰写报告

绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。

### 三、综合评价情况及评价结论

此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准,采用的方法比较法、因素分析法、公众评判法,对2023年阜康市智慧校园二期建设项目绩效进行客观评价,最终评分结果:总分为100分,绩效评级为“优”。各部分权重和绩效汇总分值如下表3-1所示(详见上传的附件):

表3-1: 2023年阜康市智慧校园二期建设项目得分表

指标类别	1.项目决策	2.过程管理	3.项目产出	4.项目效益	合计
权重	20	20	30	30	100
分值	20	20	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成,权重分20分,实际得分20分,各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示(详见上传的附件):

表4-1 项目决策指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目立项	5	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	5	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	3	3
合计			20		20	20



### 1. 立项依据充分性

①项目立项符合《关于重申严格执行基本建设程序和审批规定的通知》、国民经济发展规划、《政府采购法》、及《招标投标法》；

②项目立项符合《教育部关于印发〈教育信息化 2.0 行动计划〉的通知》（教技〔2018〕6 号）、《教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》（教技〔2021〕6 号）及《教育部关于加强新时代教育管理信息化工作的通知》（教技〔2021〕13 号）；

③项目立项与教育局负责全市各级各类教育的统筹规划和综合协调，负责市各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设部门职责相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

综上，该项指标满分 2 分，得分 2 分。

### 2. 立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

综上，该项指标满分 3 分，得分 3 分。

### 3. 绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

- ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;
- ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;
- ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

综上,该项指标满分5分,得分5分。

#### 4. 绩效指标明确性

- ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;
- ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现;
- ③与项目目标任务数或计划数相对应。

综上,该项指标满分5分,得分5分。

#### 5. 预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证;
- ②预算内容与项目内容匹配;
- ③预算额度测算依据充分,按照标准编制;
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

综上,该项指标满分2分,得分2分。

#### 6. 资金分配合理性

- ①预算资金分配依据充分;
- ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。

综上,该项指标满分3分,得分3分。

### (二) 项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成,权重分20分,实际得分20分,各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示(详

见上传的附件)：

表 4-2 项目管理指标及分值情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
过程管理	20	资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
合计			20		20	20

#### 1. 资金到位率

资金到位率 =  $(2000/2000) \times 100\% = 100\%$

综上，该项指标满分 4 分，得分 4 分。

#### 2. 预算执行率

预算执行率 =  $(2000/2000) \times 100\% = 100\%$

综上，该项指标满分 4 分，得分 4 分。

#### 3. 资金使用合规性

①符合《行政单位财务规则》（财政部 113 号令）以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上，该项指标满分 4 分，得分 4 分。

#### 4. 管理制度健全性

①已制定《阜康市教育局关于进一步加强财务管理的通知》、《教育局财务管理制度》及《阜康市教育局建设项目管理制度》；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

综上，该项指标满分 4 分，得分 4 分。

#### 5. 制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目及支出未调整；

③《阜康市智慧校园建设项目二期可行性研究报告》、《关于<昌吉州阜康市智慧校园二期建设项目可行性研究报告>的批复》（阜发改投资〔2021〕146 号）、《阜康市项目工作领导小组会议纪要》（阜项目领导小组〔2022〕1 号）、《2023 年阜康市智慧校园二期建设项目工程总承包合同》、《2023 年阜康市智慧校园二期建设项目竣工验收》等资料齐全并及时归档；

④项目实施已组建由承建方及各共建单位组成的项目领导小组及其办事机构。在项目领导小组的领导下，在领导小组办公室的具体组织下，充分发挥各共建单位的积极性，解决项目建设和运行中出现的问题。运营维护和技术支持人员已参加供应商组织的培训，能熟练进行系统的全部运行操作、系统维护和故障的分析处理，经考核合格后上岗；对于业务人员，确保能够掌握与自身职责相关的系统操作，熟练高效的使用本系统，保障业务经办的顺利开展。本项目开展所需的物质资源和设备均满足要求，确保项目所需的物质资源和设备的可用性、数量和质量，并制定采购计划。此外，各共建单位在信息化建设方面已经具备了“教育信息化 1.0”的基础条件，这将大大减少本项目的风险，为项目的成功实施提供了强有力的保障。

综上，该项指标满分 4 分，得分 4 分。



### （三）项目产出情况

项目产出类指标由 4 个二级指标和 9 个三级指标构成，权重分 30 分，实际得分 30 分，各指标业绩值和绩效分值如表 4-3 所示（详见上传的附件）：

表 4-3 项目产出指标及分值情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	标杆分值	全年实际完成值	指标得分
产出	数量指标	项目实施幼儿园、分园、教学点数	≥34 所	3	34 所	3
		阜康市智慧校园二期建设项目建设内容数	≥7 个	3	7 个	3
	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	3	100%	3
		设施设备采购质量合格率	=100%	3	100%	3
	时效指标	资金支付及时率	=100%	3	100%	3
		资金支付工作完成时限	2023 年 7 月底前	3	2023 年 7 月 27 日	3
	成本指标	阜康市智慧校园二期建设项目工程建设 30%预付款	≤647.94 万元	4	647.94 万元	4
		阜康市智慧校园二期建设项目工程建设 80%进度款	≤1079.9 万元	4	1079.9 万元	4
		阜康市智慧校园二期建设项目工程建设 97%进度款	≤272.16 万元	4	272.16 万元	4
合计				30		30

#### 1. 项目完成数量

“项目实施幼儿园、分园、教学点数”指标，预期目标值为≥34 所，实际完成为 34 所。实际完成率=（34/34）×100%=100%。

“阜康市智慧校园二期建设项目建设内容数”指标，预期目标值为≥7 个，实际完成为 7 个。实际完成率=（7/7）×100%=100%。

综上，该项指标满分 6 分，得分 6 分。

#### 2. 项目完成质量

“工程项目验收合格率”指标，预期目标值为=100%，实际完成

为100%。

“设施设备采购质量合格率”指标，预期目标值为=100%，实际完成为100%。

综上，该项指标满分6分，得分6分。

### 3. 项目完成时效

“资金支付及时率”指标，预期目标值为=100%，实际完成为100%。

“资金支付工作完成时限”指标，预期目标值为2023年7月底前，实际完成为2023年7月27日。

综上，该项指标满分6分，得分6分。

### 4. 项目完成成本

“阜康市智慧校园二期建设项目工程建设30%预付款”指标，预期目标值为≤647.94万元，实际完成为647.94万元。实际完成率= $(647.94/647.94) \times 100\% = 100\%$ 。

“阜康市智慧校园二期建设项目工程建设80%进度款”指标，预期目标值为≤1079.9万元，实际完成为1079.9万元。实际完成率= $(1079.9/1079.9) \times 100\% = 100\%$ 。

“阜康市智慧校园二期建设项目工程建设97%进度款”指标，预期目标值为≤272.16万元，实际完成为272.16万元。实际完成率= $(272.16/272.16) \times 100\% = 100\%$ 。

综上，该项指标满分12分，得分12分。

## （四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分

30 分，实际得分 30 分，各指标业绩值和绩效分值如表 4-4 所示（详见上传的附件）：

表 4-4 项目效益指标及分值情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	标杆分值	全年实际完成值	指标得分
效益	经济效益指标	/	/	/	/	/
	社会效益指标	教育信息资源合理有效配置	促进	10	100%	10
		教育信息化师资队伍队伍建设	加强	10	100%	10
	生态效益指标	/	/	/	/	/
	可持续影响指标	/	/	/	/	/
	满意度指标	学生满意度	≥95%	10	100%	10
合计				30		30

#### 1. 经济效益指标

本项目不涉及经济效益指标。

#### 2. 社会效益指标

“教育信息资源合理有效配置”指标，预期目标值为促进，实际完成为 100%。

通过项目的实施，促进教育信息资源合理有效配置。

“教育信息化师资队伍队伍建设”指标，预期目标值为加强，实际完成为 100%。

通过项目的实施，加强教育信息化师资队伍队伍建设。

综上，该项指标满分 20 分，得分 20 分。

#### 3. 生态效益指标

本项目不涉及生态效益指标。

#### 4. 满意度指标

“学生满意度”指标，预期目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成为100%。

综上，该项指标满分10分，得分10分。

## 五、预算执行进度与指标偏差

该项目预算资金总额为2000万元，全年执行数为2000万元，预算执行率为100%，总体完成率为100%。预算执行率与总体完成率之间的偏差为0%，无偏差。

## 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

2023年阜康市智慧校园二期建设项目2023年预算数为2000万元，截至2023年12月31日共支出2000万元，预算执行率为100%。

2023年阜康市智慧校园二期建设项目建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按照预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了阜康市教育局事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

### （二）存在的问题及原因分析

1. 单位内控职责不够细化，项目预算的绩效设定与实际的项目支出存在些许差距，争取在今后工作中准确把握项目资金支出，达到资金的最大效益。

2. 在资金申请工作中要积极主动联系财政部门确保资金及时落实到位，进一步按照国家有关财务规章制度规定加强资金使用管理，



确保资金用到实处，工作有序的开展，加强自身建设，提高服务能力。  
通过分析评价，发现问题及时督促整改。

## **七、有关建议**

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

## **八、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

附件一、项目支出绩效自评表  
项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称	2023 年阜康市智慧校园二期建设项目											
主管部门	阜康市人民政府				实施单位	阜康市教育局						
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分					
	年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10					
	其中:当年财政拨款	2000	2000	2000	-	-	-					
	其他资金	0	0	0	-	-	-					
年度总体目标	总体目标				总体目标完成情况							
	教育局负责全市各级各类教育的统筹规划和综合协调,负责全市各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设,为进一步建设智慧校园对于促进教师和学生尽快提高应用信息技术的水平,我市启动“阜康市智慧校园二期建设项目”,教育局 2023 年计划实施该项目。主要建设内容:对阜康市 34 所幼儿园、分园、教学点进行智慧校园信息化建设,建设智慧幼儿园(包括电子图书设备、智慧照明系统);建设智慧校园数据中心等 7 个建设项目,工程项目验收合格率预计达到 100%,设施设备采购质量合格率预计达到 100%,财政投入 2000 万元(其中:工程 30%预付款 647.94 万元、80%进度款 1079.9 万元、9%进度款 272.16 万元)用于该项目,资金预计于 2023 年 7 月底前 100%及时支付完毕。项目的实施预计达到促进教育信息资源合理有效配置,加强教育信息化师资队伍建设的效益。				截至 2023 年 12 月 31 日,本项目完成对阜康市 34 所幼儿园、分园、教学点进行智慧校园信息化建设;建设智慧幼儿园(包括电子图书设备、智慧照明系统);建设智慧校园数据中心等 7 个建设项目,工程项目验收 100%合格,设施设备采购质量 100%合格,工程 30%预付款 647.94 万元、80%进度款 1079.9 万元及 9%进度款 272.16 万元已全部及时支付完毕,达到促进教育信息资源合理有效配置,加强教育信息化师资队伍建设的效益。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	项目实施幼儿园、分园、教学点数量	≥34 所	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	34 所	100%	5	
		阜康市智慧校园二期建设项目建设内容数	≥7 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	7 个	100%	5	
		工程项目验收合格率	=100%	历史标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	
		设施设备采购质量合格率	=100%	历史标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	
		资金支付及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	10	
		资金支付工作完成时限	2023 年 7 月底前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	2023 年 7 月 27 日	100%	10	
	成本指标	阜康市智慧校园二期建设项目工程预算 30%预付款	≤647.94 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	647.94 万元	100%	5	
		阜康市智慧校园二期建设项目工程预算 80%进度款	≤1079.9 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	1079.9 万元	100%	10	
		阜康市智慧校园二期建设项目工程预算 9%进度款	≤272.16 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	272.16 万元	100%	5	
	效益指标	教育信息资源合理有效配置	促进	计划标准	/	15	按评判等级赋分	说明材料	100%	100%	15	
		教育信息化师资队伍队伍建设	加强	计划标准	/	15	按评判等级赋分	说明材料	100%	100%	15	
	总分						100 分					100

附件二、项目支出绩效评价指标体系打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2	2
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	2
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	4	4
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	4



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
产出	数量指标	项目实施幼儿园、分园、教学点数	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	3	3
		阜康市智慧校园二期建设项目建设内容数	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	3	3
	质量指标	工程项目验收合格率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量,既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	3	3
		设施设备采购质量合格率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量,既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
产出	时效指标	资金支付及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	3	3
		资金支付工作完成时限	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	3	3
	成本指标	阜康市智慧校园二期建设项目工程建设30%预付款	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	4	4
		阜康市智慧校园二期建设项目工程建设80%进度款	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	4	4
		阜康市智慧校园二期建设项目工程建设97%进度款	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	4	4

一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
效益	社会效益 指标	教育信息资源 合理有效配置	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	10
		教育信息化师 资队伍建设	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	10
	满意度指 标	学生满意度	社会公众或服务对象对 项目实施效果的满意程 度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体 或个人。一般采取社会调查的方式。	10	10
合计					100	100
